


太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

◇太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業（L=4.6km）の工区概要図

◇各工区範囲/工事車両の進入経路


- 黄色い矢印：基本的な工事車両の進入経路を示しています。
- 赤線：仮栈橋^{*}を示しています。

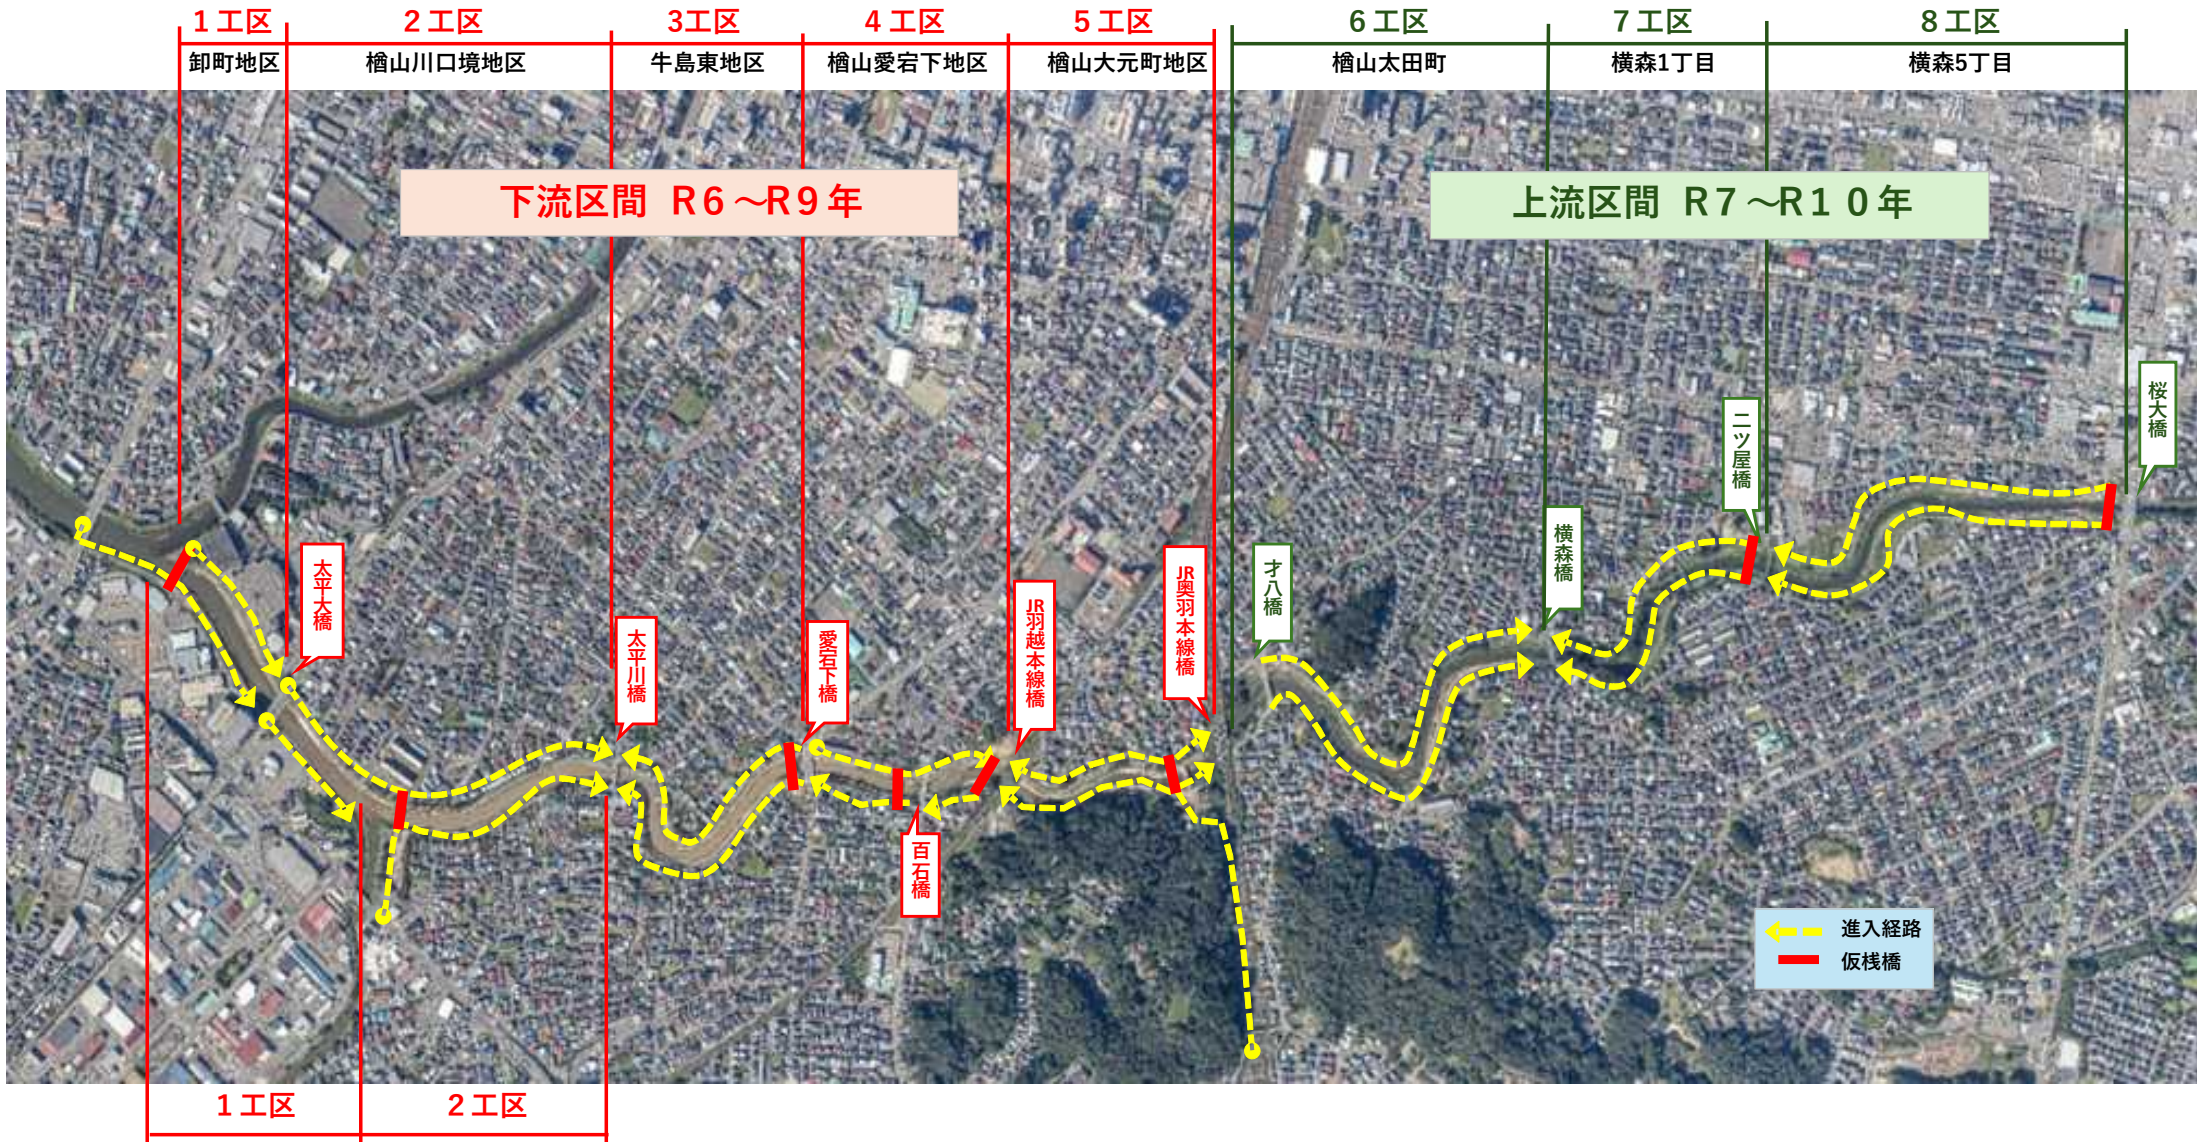

太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

◇ 1工区：標準断面図

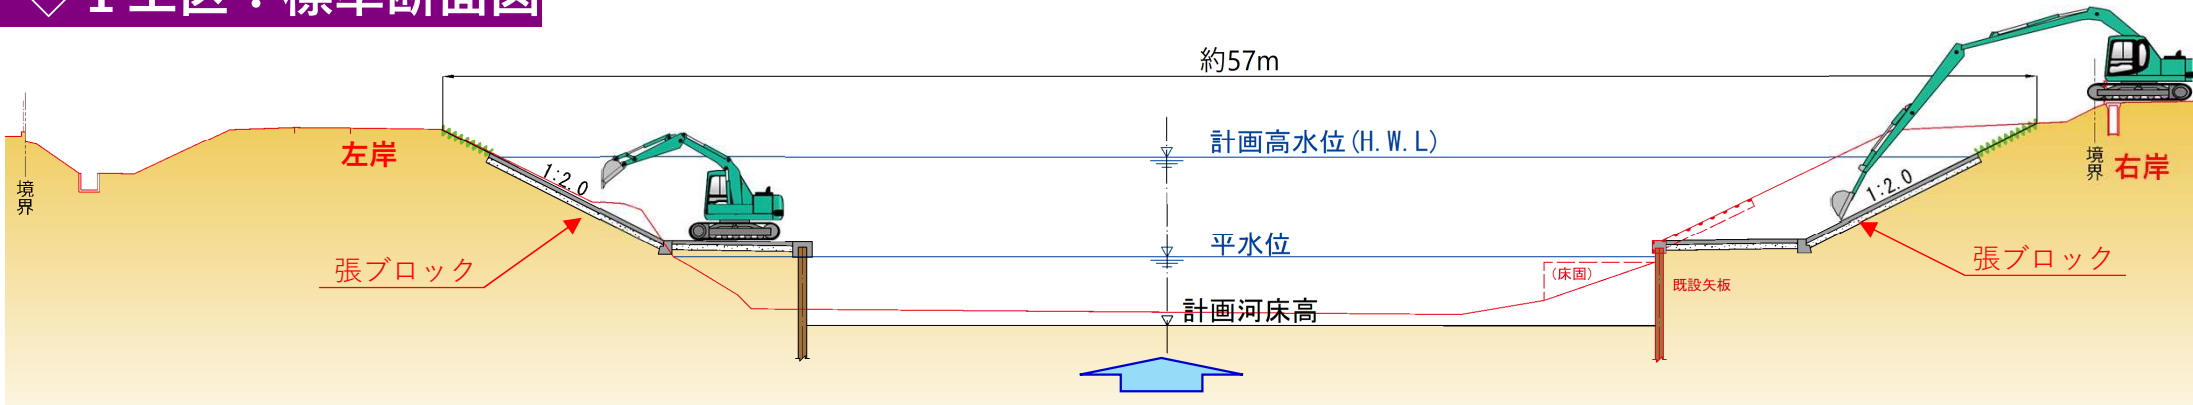


◇ 【1工区右岸：旭川合流点～太平大橋、1工区左岸：旭川合流点～猿田川合流点】改修工事の状況


- 左岸側上流部では、猿田川まで積ブロックの施工が完了しました。
- 左岸側下流部では、張ブロックの施工をしています。
- 右岸側は、張ブロックの施工をしています。



【写真①】 旭川合流点【着手前】

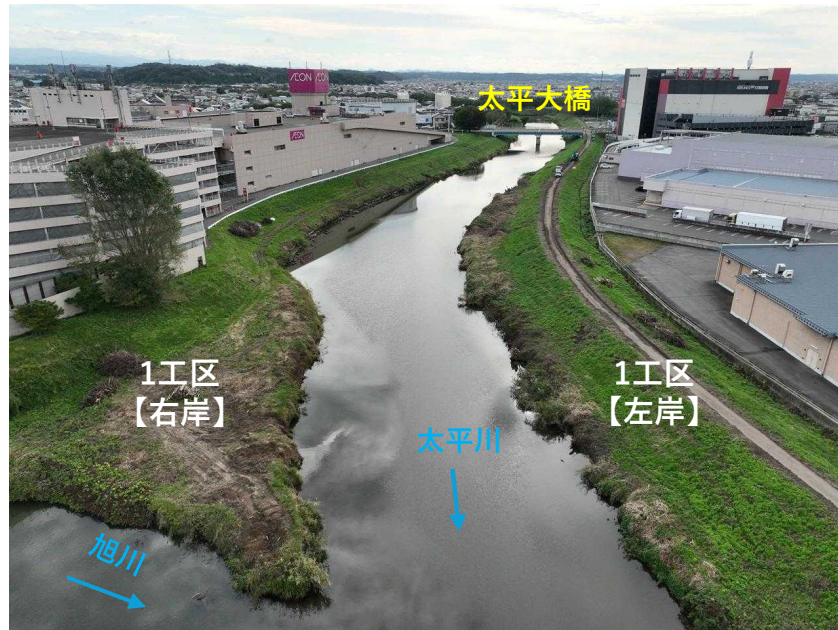


【写真②】 旭川合流点【R8.6月撮影】

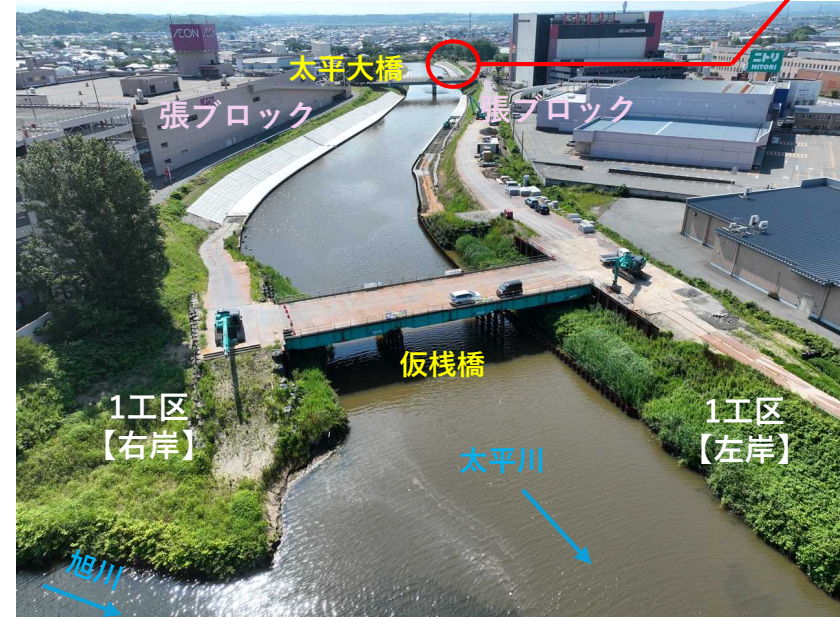

太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

◇ 2工区：標準断面図

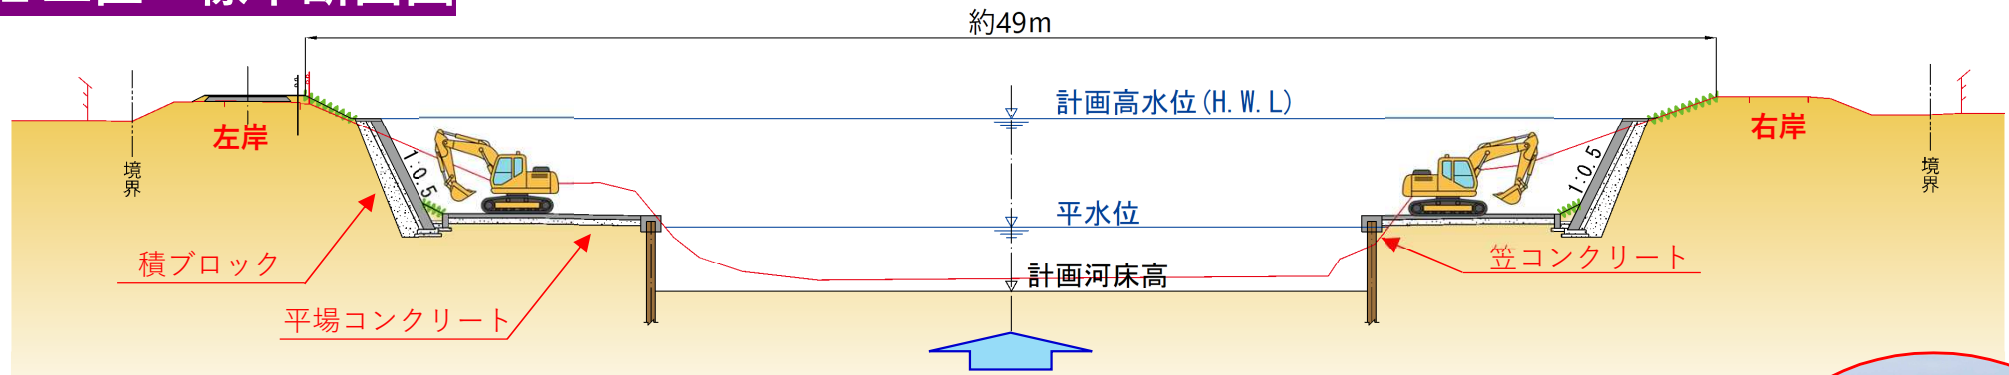

◇ 【2工区右岸：太平大橋～太平川橋、2工区左岸：猿田川合流点～太平川橋】改修工事の状況

- 左岸側は、積ブロックと平場コンクリートの施工を行っています。
- 右岸側は、笠コンクリートの施工を行っています。



【写真①】 太平川橋の下流側【着手前】




【写真②】 太平川橋の下流側【R8.6月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

◇ 3工区：標準断面図

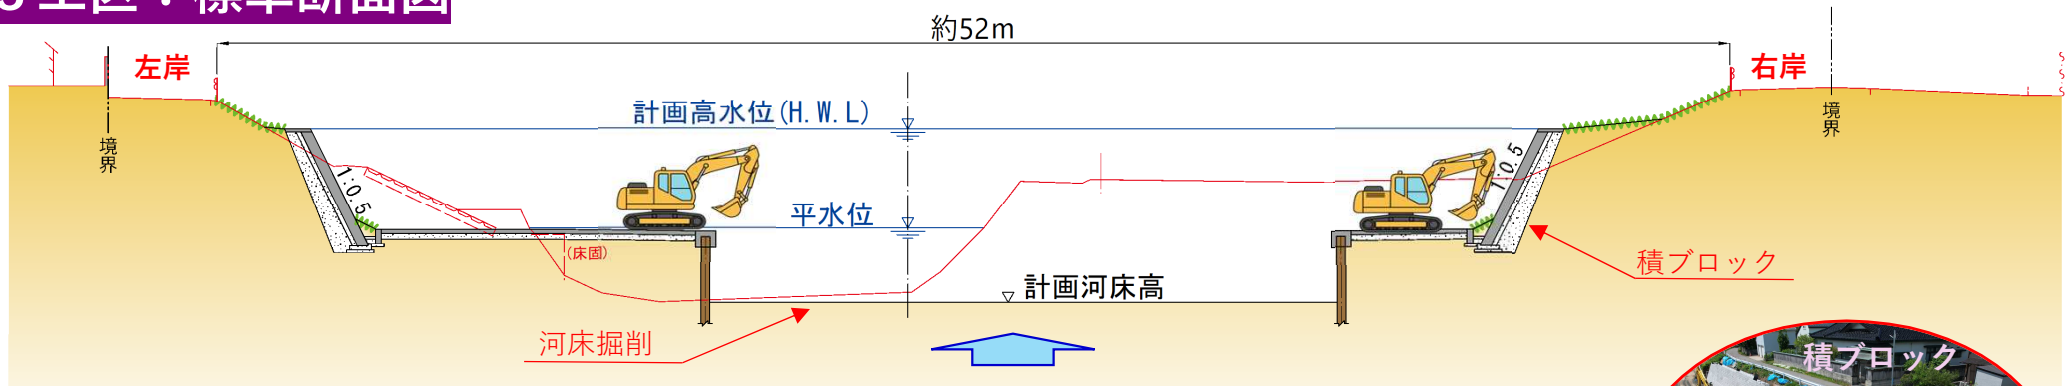

◇ 【3工区：太平川橋～愛宕下橋】改修工事の状況

- 右岸側は、積ブロックの施工を行っています。
- 左岸側は、河床掘削を行っています。
- 仮栈橋は撤去中です。



【写真①】 愛宕下橋の下流側【着手前】




【写真②】 愛宕下橋の下流側【R8.6月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

◇ 4工区：標準断面図

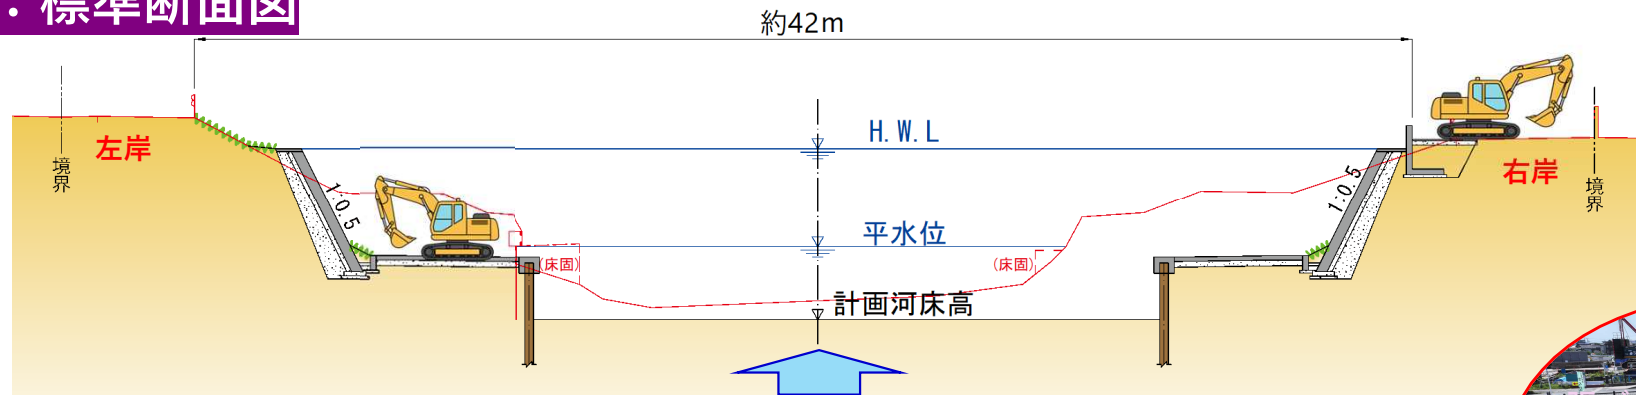


◇ 【4工区：愛宕下橋～JR羽越本線】改修工事の状況


- 左岸側の愛宕下橋、百石橋の下部では、張ブロックの施工を行っています。



【写真①】 愛宕下橋～百石橋【着手前】

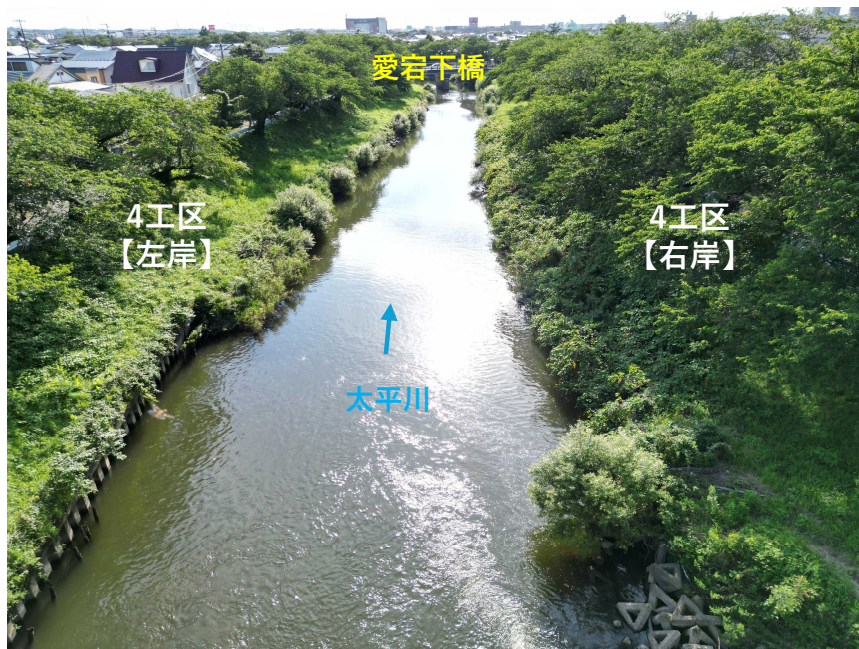


【写真②】 愛宕下橋～百石橋【R8.6月撮影】

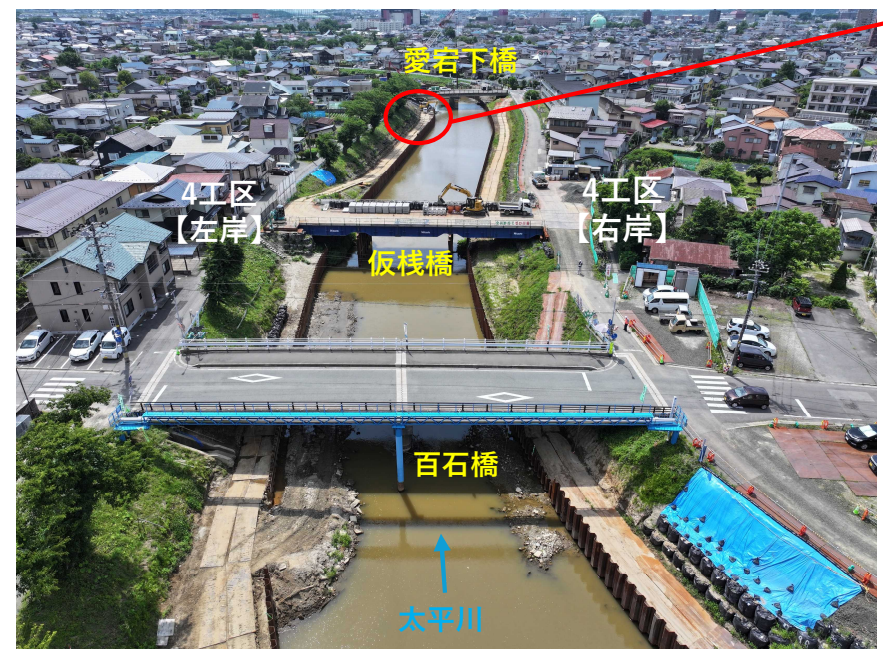

太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

◇ 5工区：標準断面図

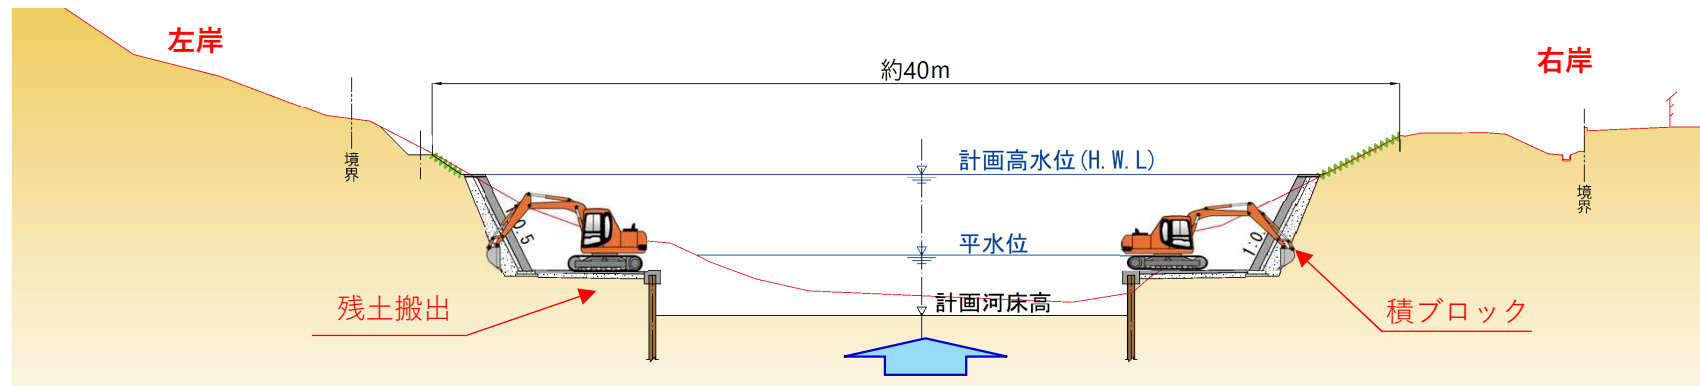

◇ 【5工区：JR羽越本線～JR奥羽本線】改修工事の状況

- 河床掘削で出た土を搬出しています。

【写真①】 JR羽越本線の上流側【着手前】




【写真②】 JR羽越本線の上流側【R8.6月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

◇ 6工区：標準断面図

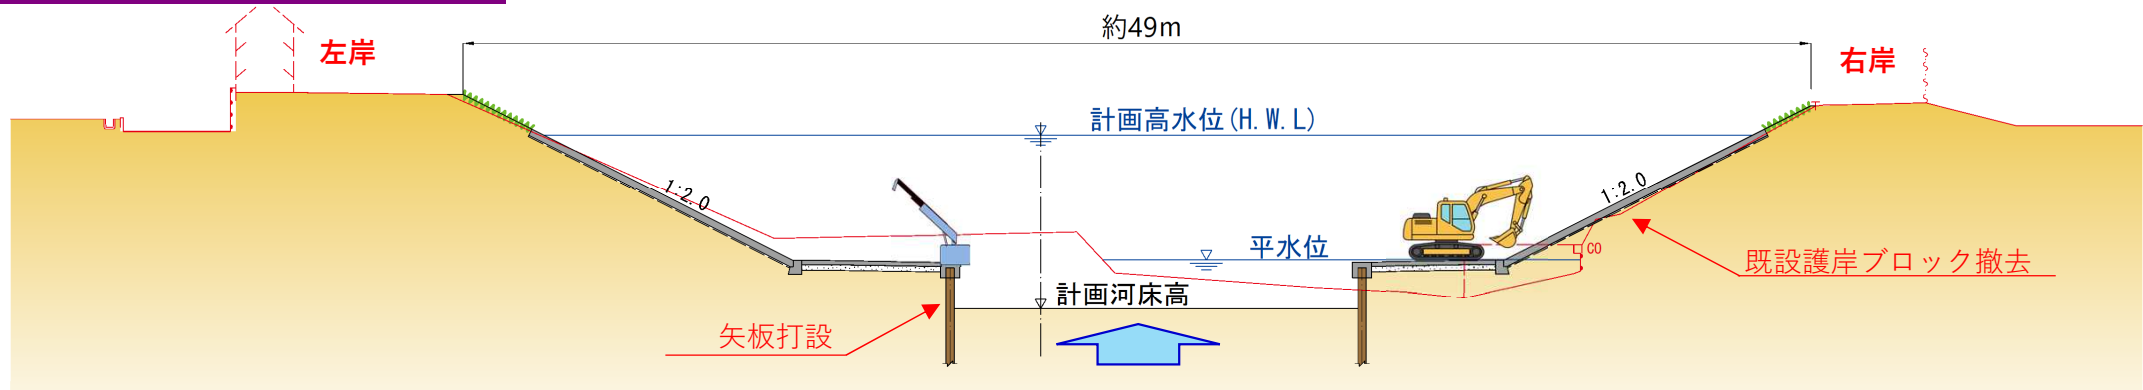

◇ 【6工区：才八橋～横森橋】改修工事の状況

- 左岸側では、矢板護岸工の施工を行っています。
- 右岸側では、既設護岸ブロックの撤去を行っています。

【写真①】 横森橋下流側 【着手前】



【写真②】 横森橋下流側 【R8.6月撮影】



1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

左岸

約54m

計画高水位 (H. W. L)

1:2.0

1:1.5

平水位

計画河床高

矢板打設

横森橋

矢板打設

右岸

- 右岸から左岸へ渡るための仮栈橋は、6月に完成しました。
- 右岸側では、横森橋より矢板護岸工の施工を行っています。

【写真①】ニツ屋橋の下流側 【着手前】



【写真②】ニツ屋橋の下流側 【R8.6月撮影】



1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.7月時点】

- ニツ屋橋上流右岸側は、川幅を広げるための掘削を行っています。
- 左岸側は、工事用道路の施工を行っています。
- 左岸施工に必要な仮栈橋は、完成済みです。

【写真②】 桜大橋の下流側 【R8.6月撮影】

