

太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.9月時点】

◇太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業（L=4.6km）の工区概要図

◇各工区範囲/工事車両の進入経路


- 黄色い矢印：基本的な工事車両の進入経路を示しています。
- 赤線：仮栈橋^{*}を示しています。



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.9月時点】

◇ 1工区：標準断面図

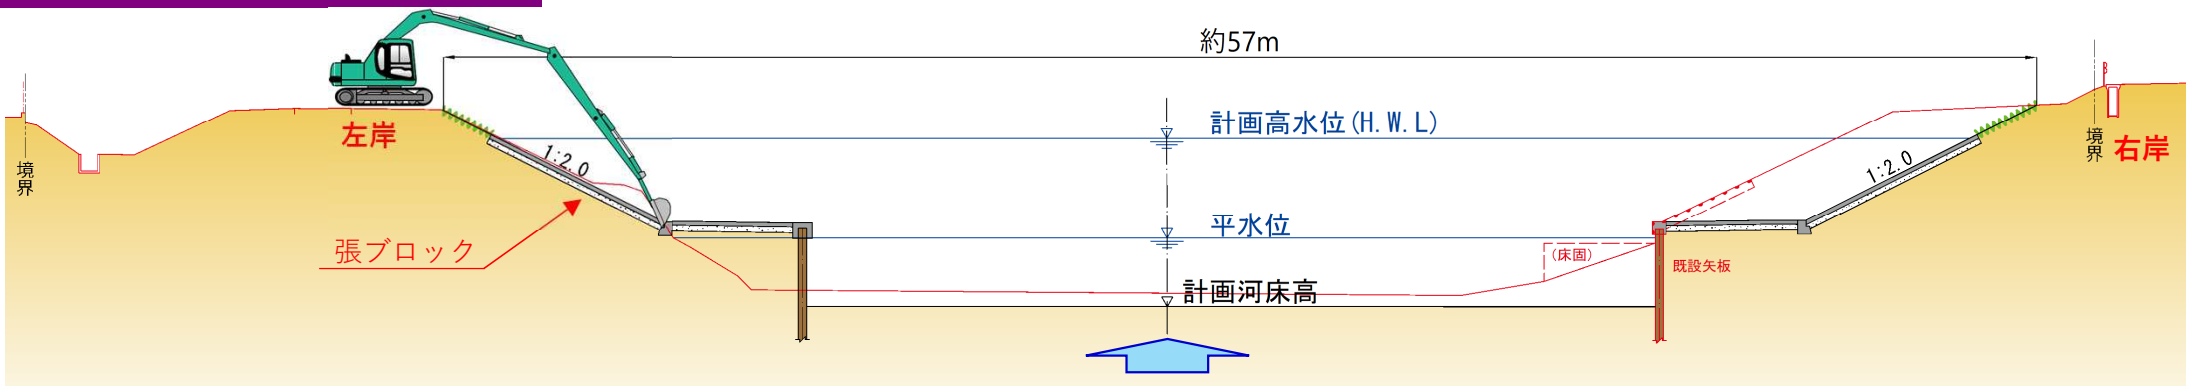


◇ 【1工区右岸：旭川合流点～太平大橋、1工区左岸：旭川合流点～猿田川合流点】改修工事の状況

- 左岸側上流部では、猿田川まで積ブロックの施工が完了しました。
- 左岸側下流部では、張ブロックの施工をしています。
- 右岸側の張ブロックの施工は完了しました。

【写真①】 旭川合流点【着手前】




【写真②】 旭川合流点【R8.8月撮影】

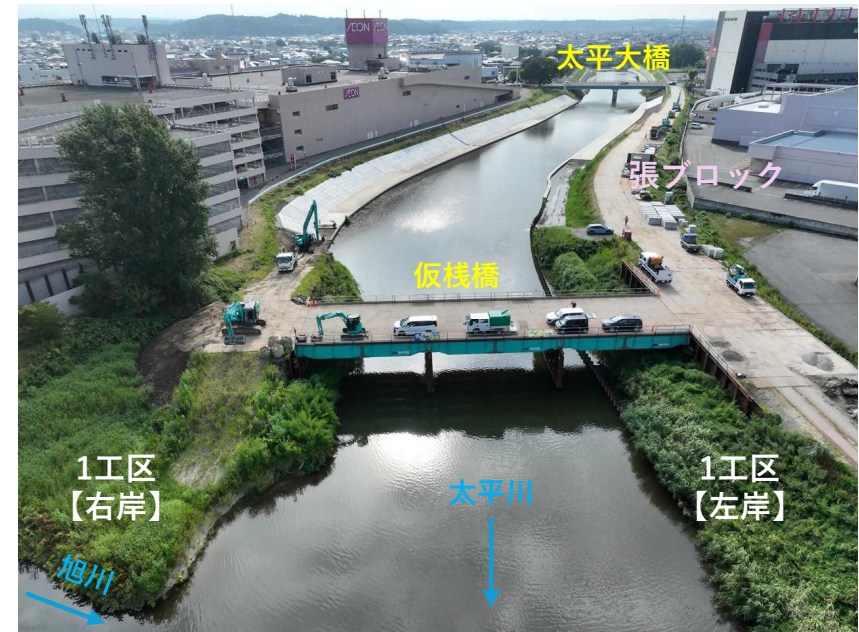

太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.9月時点】

◇ 2工区：標準断面図

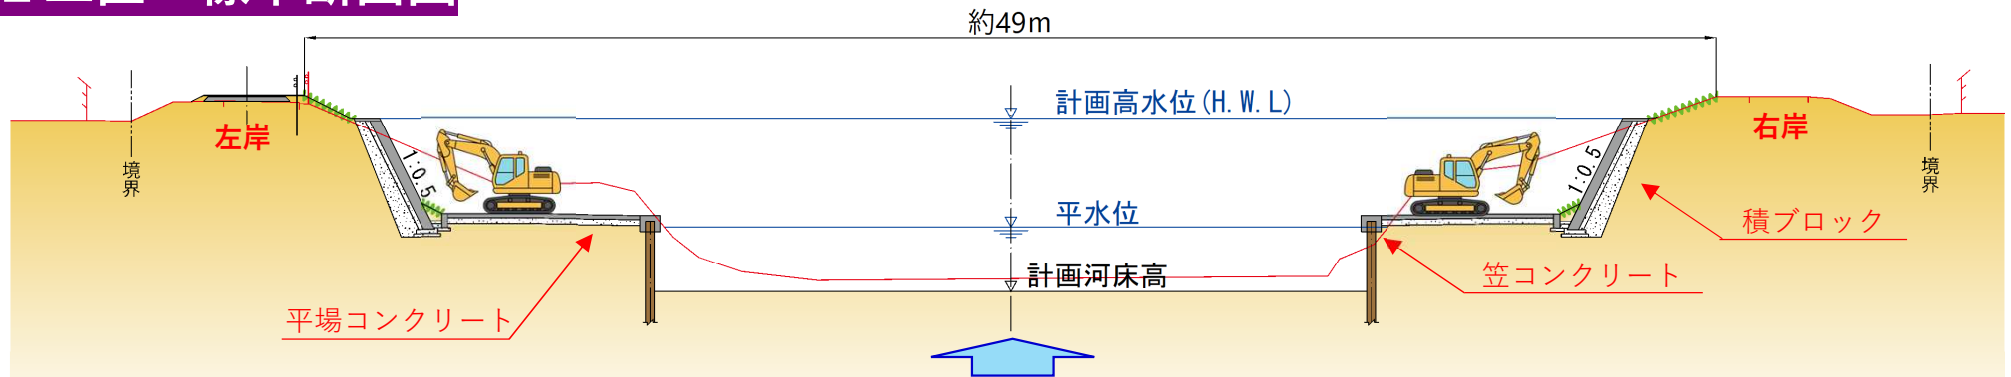

◇ 【2工区右岸：太平大橋～太平川橋、2工区左岸：猿田川合流点～太平川橋】改修工事の状況

- 左岸側は、平場コンクリートの施工を行っています。
- 右岸側は、積ブロック、笠コンクリートの施工を行っています。

【写真①】 太平川橋の下流側【着手前】




【写真②】 太平川橋の下流側【R8.8月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.9月時点】

◇ 3工区：標準断面図

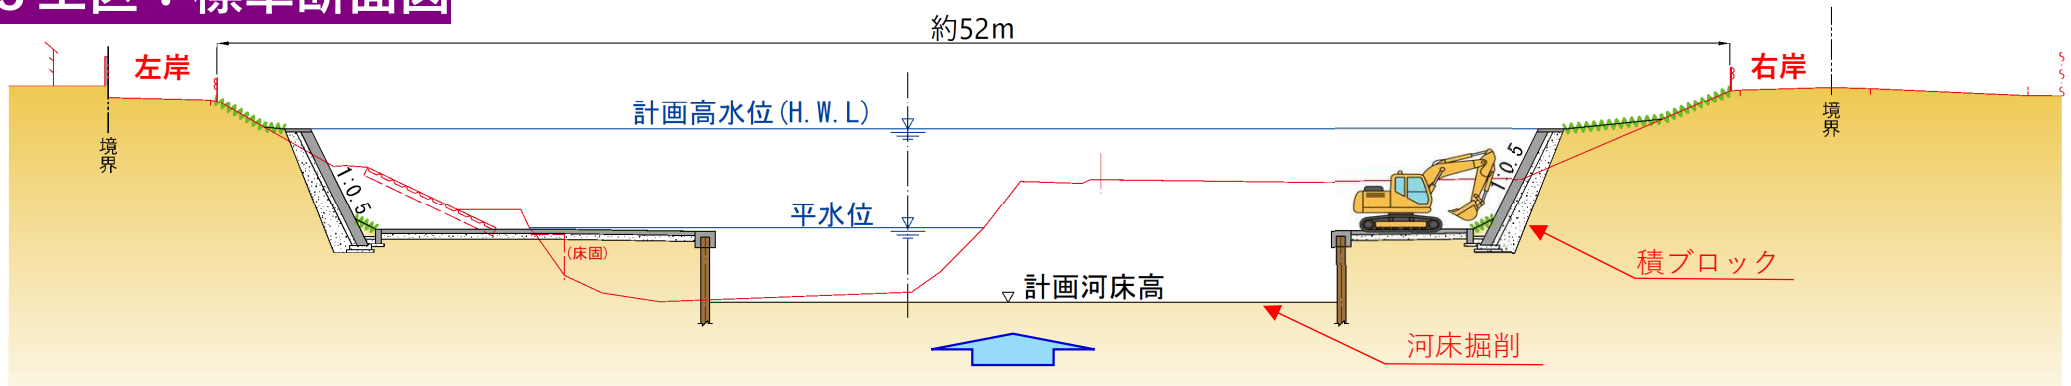

◇ 【3工区：太平川橋～愛宕下橋】改修工事の状況

- 右岸側は、積ブロックの施工を行っています。
- 左岸側の河床掘削は完了し、現在は右岸側の河床掘削を行っています。
- 仮栈橋は、矢板工施工のために設置しておりましたが、その作業を終えたため、撤去しました。

【写真①】 愛宕下橋の下流側【着手前】




【写真②】 愛宕下橋の下流側【R8.8月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.9月時点】


◇ 4工区：標準断面図

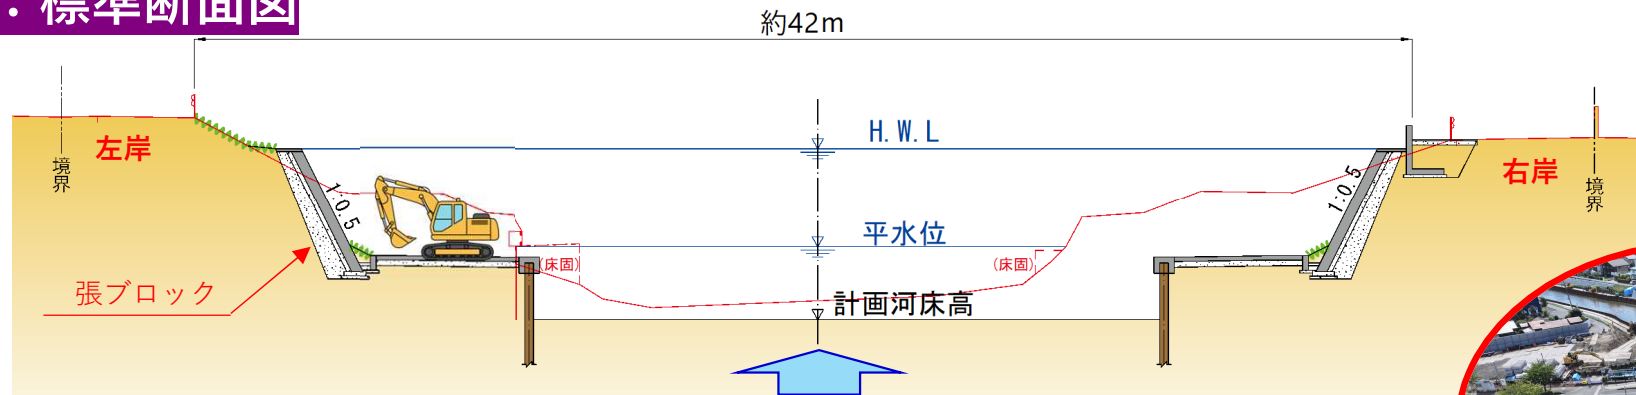


◇ 【4工区：愛宕下橋～JR羽越本線】改修工事の状況

- 左岸側の愛宕下橋では張ブロックから積ブロックへのすりつけ、百石橋の下部では、張ブロックの施工を行っています。

【写真①】 愛宕下橋～百石橋【着手前】

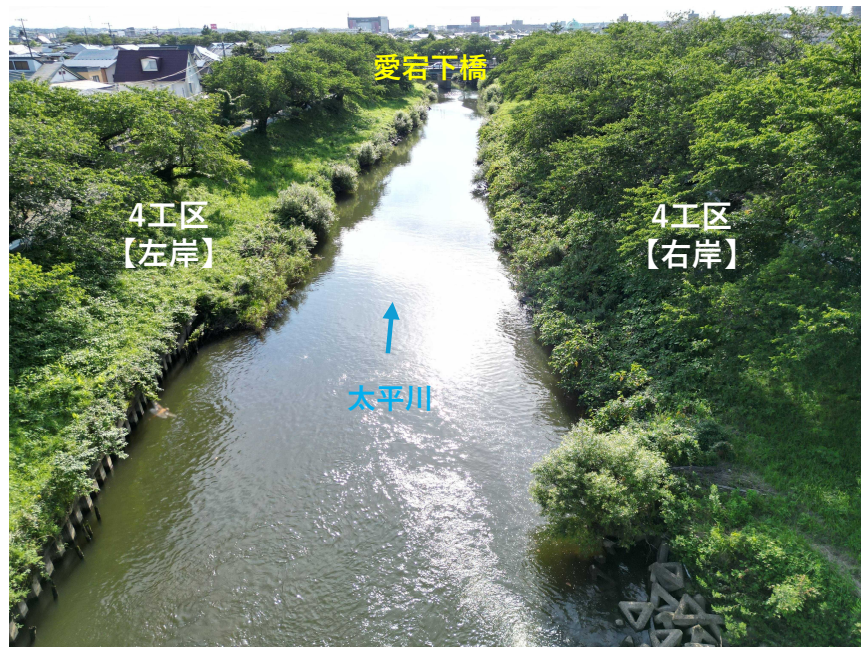


【写真②】 愛宕下橋～百石橋【R8.8月撮影】

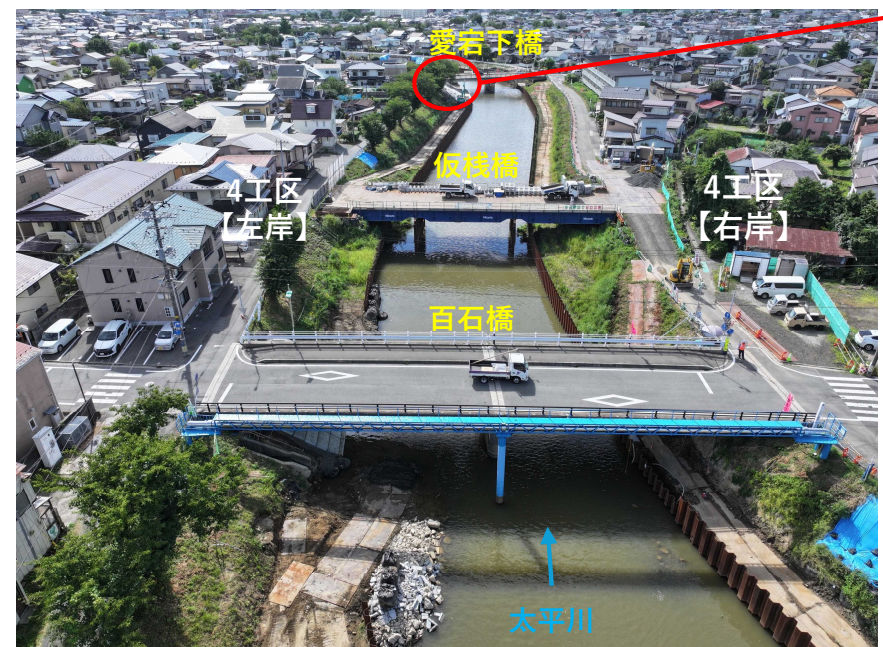

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.9月時点】

◆ 6 工区：標準断面図

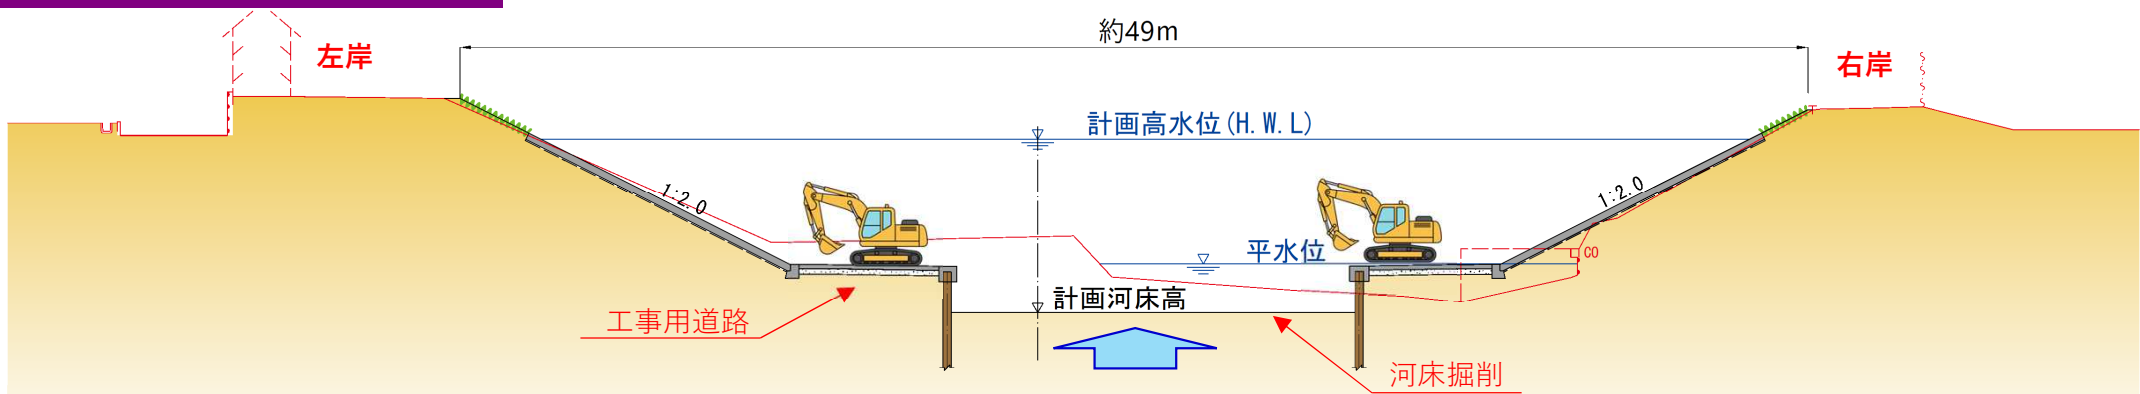


◇ 【6工区：才八橋～横森橋】 改修工事の状況

- 左岸側才八橋上流では、矢板打設に向けて工事用道路の施工を行っています。
- 右岸側では、河床掘削を行っています。

【写真①】 横森橋下流側 【着手前】




【写真②】 横森橋下流側 【R8.8月撮影】

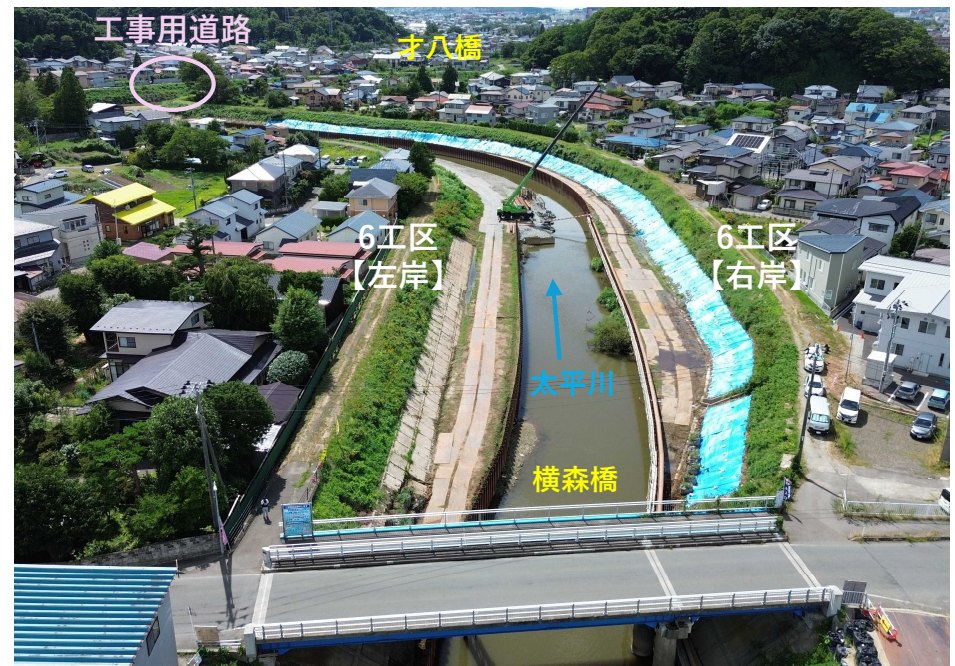

太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.9月時点】

◇7工区：標準断面図

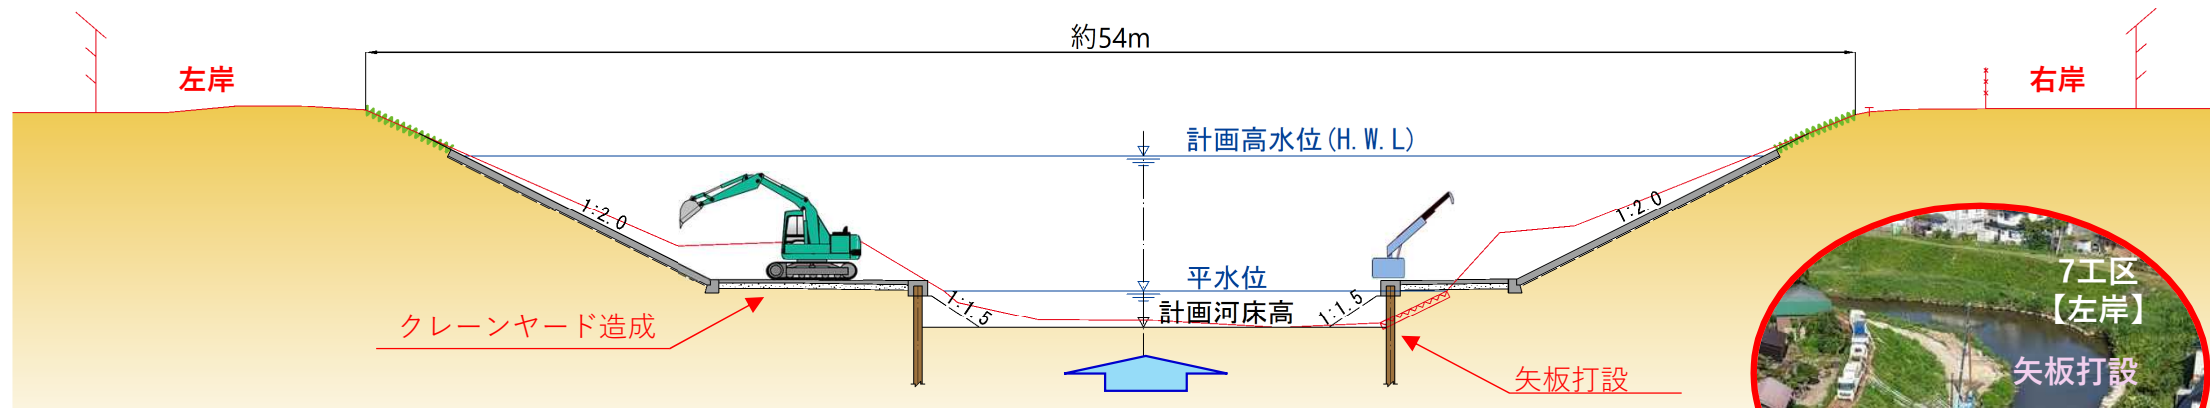

◇【7工区：横森橋～ニツ屋橋】改修工事の状況

- 左岸側では、工事用道路の施工を行っています。
- 右岸側では、上流に向かって矢板護岸工の施工を行っています。

【写真①】ニツ屋橋の下流側 【着手前】




【写真②】ニツ屋橋の下流側 【R8.8月撮影】



太平川 河川激甚災害対策特別緊急事業

1～8工区 / 工事の進捗状況【R8.9月時点】

◇8工区：標準断面図

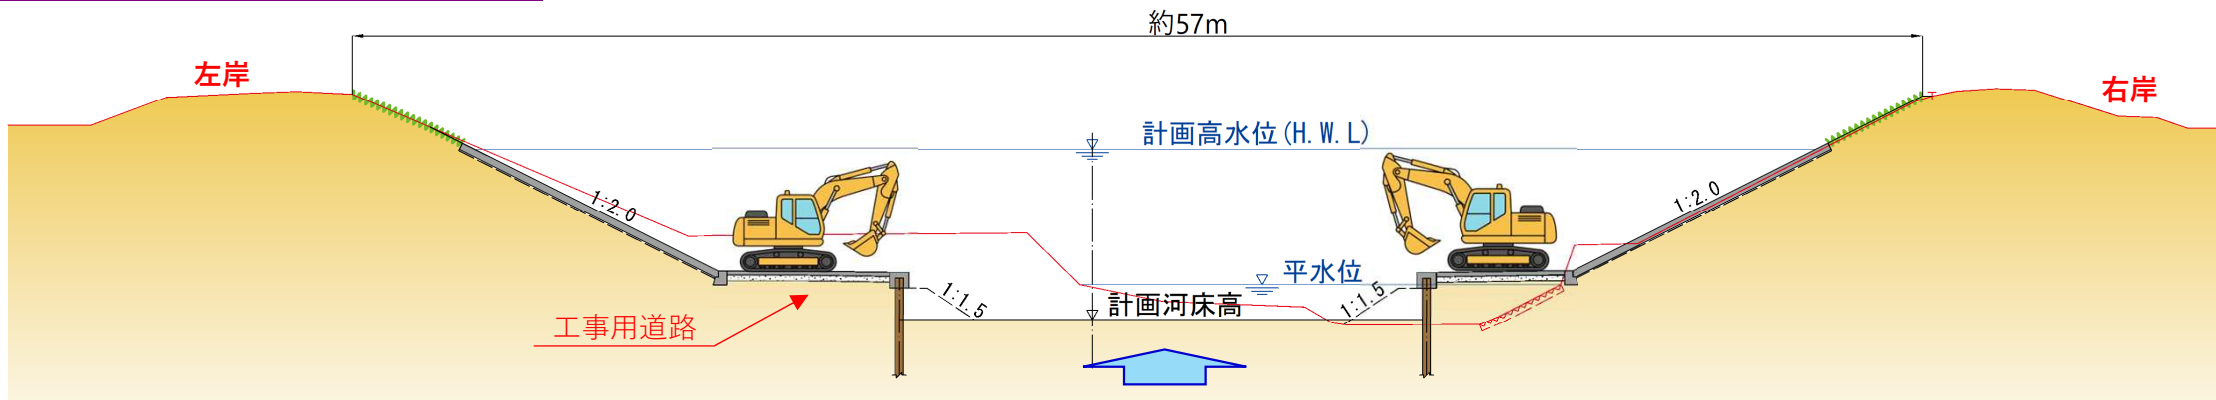

◇【8工区：ニツ屋橋～桜大橋】改修工事の状況

- 右岸側は、矢板護岸工の準備作業を行っています。
- 左岸側は、工事用道路の施工を行っています。

【写真①】 桜大橋の下流側 【着手前】



【写真②】 桜大橋の下流側 【R8.8月撮影】

