

(様式8)

公共事業終了箇所評価調書

評価確定日(平成19年 11月28日)

事業コード	H19 - 建 - 終 - 16		区 分	国庫補助 県単独
事業名	地方港湾改修事業		部 局 課 室 名	建設交通部 港湾空港課
事業種別	小型船だまり		班 名	港湾班 (tel)018-860-2545
路線名等	本荘港		担 当 課 長 名	山内 啓一
箇所名	由利本荘市田尻地区		担 当 者 名	吉田 雄
総合計画との関連	政策コード	K	政 策 名	水と緑豊かな自然環境と人との共生
	施策コード	3	施 策 名	自然とふれあう多彩な活動の推進
	指標コード	2	施策目標(指標)名	親水空間整備率

1. 事業の概要

事業の背景及び目的	本荘港及びマリナー利用船舶の入出港時の安全確保 海難事故発生時の救難体制及び震災時等の緊急物資輸送体制の確立 釣船等、小型船対応の係留施設の確保					
事業期間	前回	H1年 ~ H14年	総事業費	前回	63.3 億円	
	終了	H1年 ~ H17年		終了	61.8 億円	
事業規模	前回	物揚場(-3~-4m)、船揚場 L=300m	防波堤 L=310m	他		
	終了	物揚場(-3~-4m)、船揚場 L=300m	防波堤 L=285m	他		
事業効果の要因変化及び発現状況	前回評価計画		最終	増減	理由	
	事業費		6,333,800	6,182,900	-150,900	
	経内費	工事	6,333,800	6,182,900	-150,900	
		用補	0	0	0	
		その他	0	0	0	
	事業内容		物揚場、船揚場、防波堤、道路、護岸	物揚場、船揚場、防波堤、道路、護岸、導流堤、泊地		航路幅確保及び船舶の輻輳を軽減するため、マリナー港口部の位置及び防波堤の規模を変更。防波堤L=310m L=285m
	コスト・効果対比較		費用便益変化の主な要因(前回評価 終了)			
	最終コスト 終了C / 前回評価C = (0.98)		【便益】 特になし。			
	費用便益 前回評価B / C = (1.1)		【費用】 特になし。			
	終了B / C = (1.1)					
目標達成率	指標名	本荘マリナーの利用隻数				
	指標式	(入廷数) / (目標入艇数)				
	指標の種類	成果指標	業績指標	低減指標の有無	有 無	
	目標値a	135 隻数		データ等の出典	本荘利用マリナー利用実績報告書	
	実績値b	127 隻数				
	達成率b/a	94 %		把握の時期	平成19年 9月	
	指標を設定することができなかった場合の効果の把握方法 指標を設定することができなかった理由及び把握方法と成果 データの出典含む					
自然環境の変化	航路を変更することにより、子吉川からマリナーへのゴミの流入がなくなる等、利用環境が向上した。					
社会経済情勢の変化	平成17年3月22日に本荘市を含める8市町が合併し由利本荘市となった。					
事業終了後の問題点及び管理・利用状況	秋田県港湾・河川の船舶係留保管適正化計画に対して、マリナー及び-3m物揚場を係留保管施設として利用可能である。					

住民満足度等の状況 (事業終了後)	満足度を把握した対象 受益者 一般県民 (時期:平成19年 7月) 満足度把握の方法 アンケート調査 各種委員会及び審議会 ヒアリング インターネット その他の方法 (具体的に) 満足度の状況 利用者へのアンケート調査から、75%以上の方が航路の安全性、港内の静穏度、ゴミ等の流入に関して以前より向上したと評価している。また、90%以上の方が今後も本荘港を利用したいと考えている。
上位計画での位置付け	あきた21総合計画では、自然とふれあう多彩な活動の推進に位置づけられている。
関連プロジェクト等	特になし。
前回評価結果等	選定または継続 改善 見直し 保留又は中止 指摘事項 特になし。 指摘事項への対応 特になし。

2. 所管課の自己評価

観点	評価の内容(特記事項)	評価結果
有効性	住民満足度の状況 A B C アンケート結果からも、満足度は高い。	A
	事業の効果 A 達成率100%以上 B 達成率80%以上100%未満 C 達成率80%未満 本荘マリーナの利用隻数は増加傾向にあるほか、耐震物揚場の整備による震災時等の緊急物資輸送体制の確立や、子吉川からの流木処理費用の削減等、その効果は大きい。	B C
	事業の経済性の妥当性 A B C B/Cが1.0以上であるほか、本荘マリーナ海上祭やみなとオアシス等の各種イベントに利活用されており、その経済性は妥当である。	A B
効率性	コスト縮減の状況 A 縮減率20%以上 B 縮減率20%未満 C 縮減なし -	C
	総合評価 A (妥当性が高い) B (概ね妥当である) C (妥当性が低い) アンケート結果からも住民満足度は高く、また各種イベント等に本荘港が利活用されており、事業は妥当である。	

3. 評価結果の同種事業への反映状況等(対応方針)

事業実施前の設計及び調査段階で現場の把握や、実施・詳細設計における適正な事業費の把握に努め、コスト縮減に関しても積極的な取り組みをし、効率的な事業執行を図る。


4. 公共事業評価専門委員会意見

県の対応方針を「可」とする。

総合評価の判定基準

総合評価の区分	判定基準	総合評価
A (妥当性が高い)	全ての観点の評価結果が「A」判定の場合	A
B (概ね妥当である)	「A」判定、「C」判定以外の場合	
C (妥当性が低い)	全ての観点の評価結果が「C」判定の場合	

本荘港港湾計画平面図

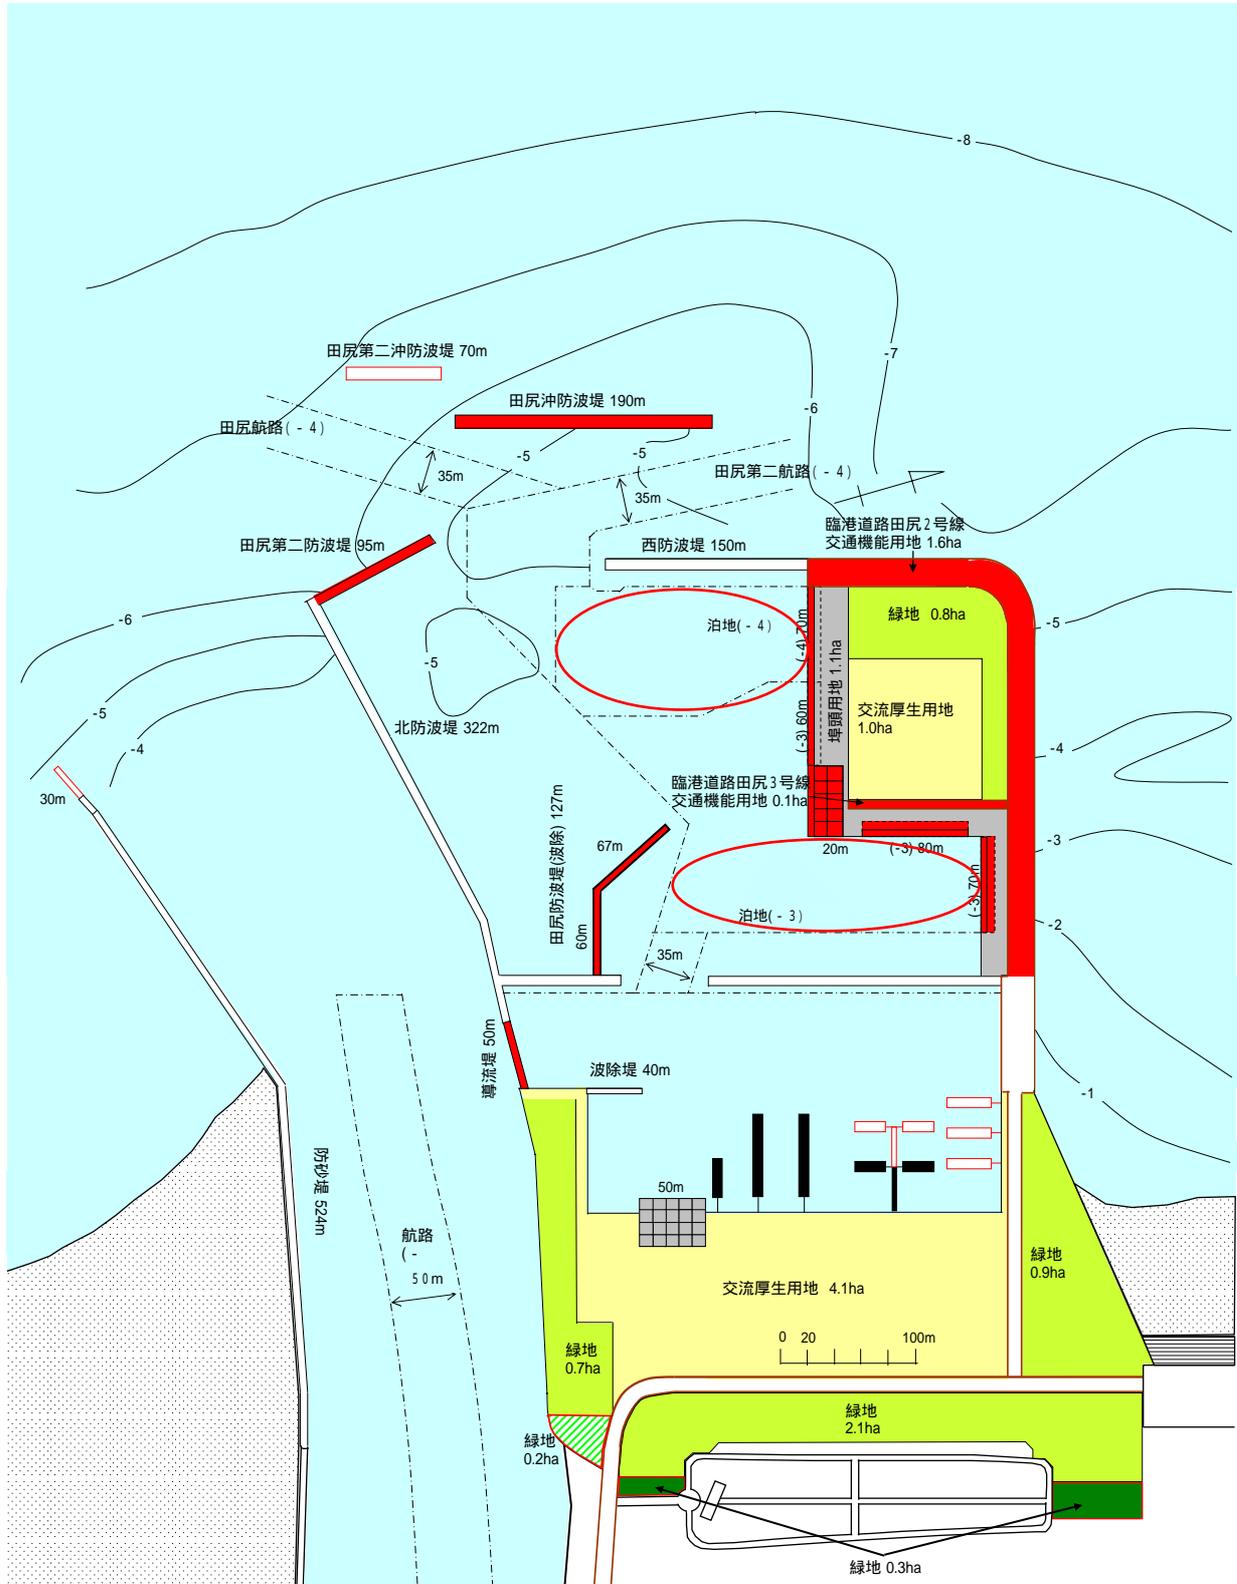

事業評価対象箇所



H19 航空写真



S63 航空写真





H19.7 みなとオアシス画廊の制作状況



H19.7 海上保安部巡視艇すぎかぜ来航

地域を潤す力に

「みなとオアシス」認定

国文書

「みなとオアシス」は、地域の活性化と観光の振興を目的として、国文書として認定された。認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

港にぎわいの拠点に

本荘港の事業選定

実業モザイク

本荘港の活性化と観光の振興を目的として、国文書として認定された。認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

防波堤を画廊に

32校400人がペイント

完成は来月初めの予定

由利本荘市「みなとオアシス事業」

防波堤の活性化と観光の振興を目的として、国文書として認定された。認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。



下瀬には1777で色や字を塗り、第一防波堤は11月16日完成予定

防波堤210mを画廊に

小中学生ら30グループ

海などテーマ40作品

由利本荘市「みなとオアシス事業」

防波堤の活性化と観光の振興を目的として、国文書として認定された。認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。



本荘港に完成した「みなとオアシス」防波堤に「海じょう」一画が完成した。11月16日完成予定


防波堤の活性化と観光の振興を目的として、国文書として認定された。認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。


認定されたのは、秋田県内では初めてのことで、地域の活性化と観光の振興に大きく貢献するものと期待されている。

本荘港アンケート調査結果


質問	また本荘港・本荘マリーナを利用したいと思いますか？	
	1) 多く利用したいと思う	28
	2) たまに利用したいと思う	21
	3) あまり利用したいと思わない	0
	4) 利用したいと思わない	0
	5) 分からない	2
	無回答	0



質問	現在の航路の安全性についてどのように思いますか？	
	1) 以前より十分に安全になった	8
	2) 以前より多少安全になった	12
	3) あまり変わらない	2
	4) 以前より悪くなった	1
	5) 分からない	2
	無回答	1



質問	港内の"波の穏やかさ"についてどのように思いますか？	
	1) 以前より十分に穏やかになった	10
	2) 以前より多少穏やかになった	10
	3) あまり変わらない	3
	4) 以前より悪くなった	0
	5) 分からない	3
	無回答	0



質問	係留施設的环境についてどのように思いますか？	
	1) ゴミ等の流入が少なくなって十分に良くなった	9
	2) ゴミ等の流入が少なくなって多少良くなった	11
	3) あまり変わらない	4
	4) 以前より悪くなった	1
	5) 分からない	1
	無回答	0

