

令和2年度環境保全対策の実施状況について

1 汚水処理等の維持管理

1-1_目 的

・ 1 号水処理施設、3 号水処理施設、新水処理施設及び促進酸化施設による汚水処理等の維持管理や施設の修繕などを実施するものである。

1-2_揚水井戸の洗浄 8 箇所、9 回 : ●

・ 2 1 号揚水井戸 φ 2 0 0 mm、深さ 2 3 m (平成 2 2 年度 県設置)

・ 2 3 号揚水井戸 φ 2 0 0 mm、深さ 5 m (平成 2 4 年度 県設置)

・ 2 4 号揚水井戸 φ 2 0 0 mm、深さ 2 3 m (平成 2 5 年度 県設置)

・ 2 5 号揚水井戸 φ 2 0 0 mm、深さ 2 2 m (平成 2 5 年度 県設置)


・ 2 7 号揚水井戸 φ 3 0 0 mm、深さ 2 4 m (平成 2 6 年度 県設置)

・ 4 - 2 号揚水井戸 φ 1 0 0 mm、深さ 2 6 m (平成 2 5 年度 県設置)

・ 5 - 2 号揚水井戸 φ 1 0 0 mm、深さ 3 5 m (平成 2 5 年度 県設置)

・ 1 3 - 2 号揚水井戸 φ 2 0 0 mm、深さ 3 3 m (平成 2 6 年度 県設置)

※ 2 1 号井戸は 2 回実施

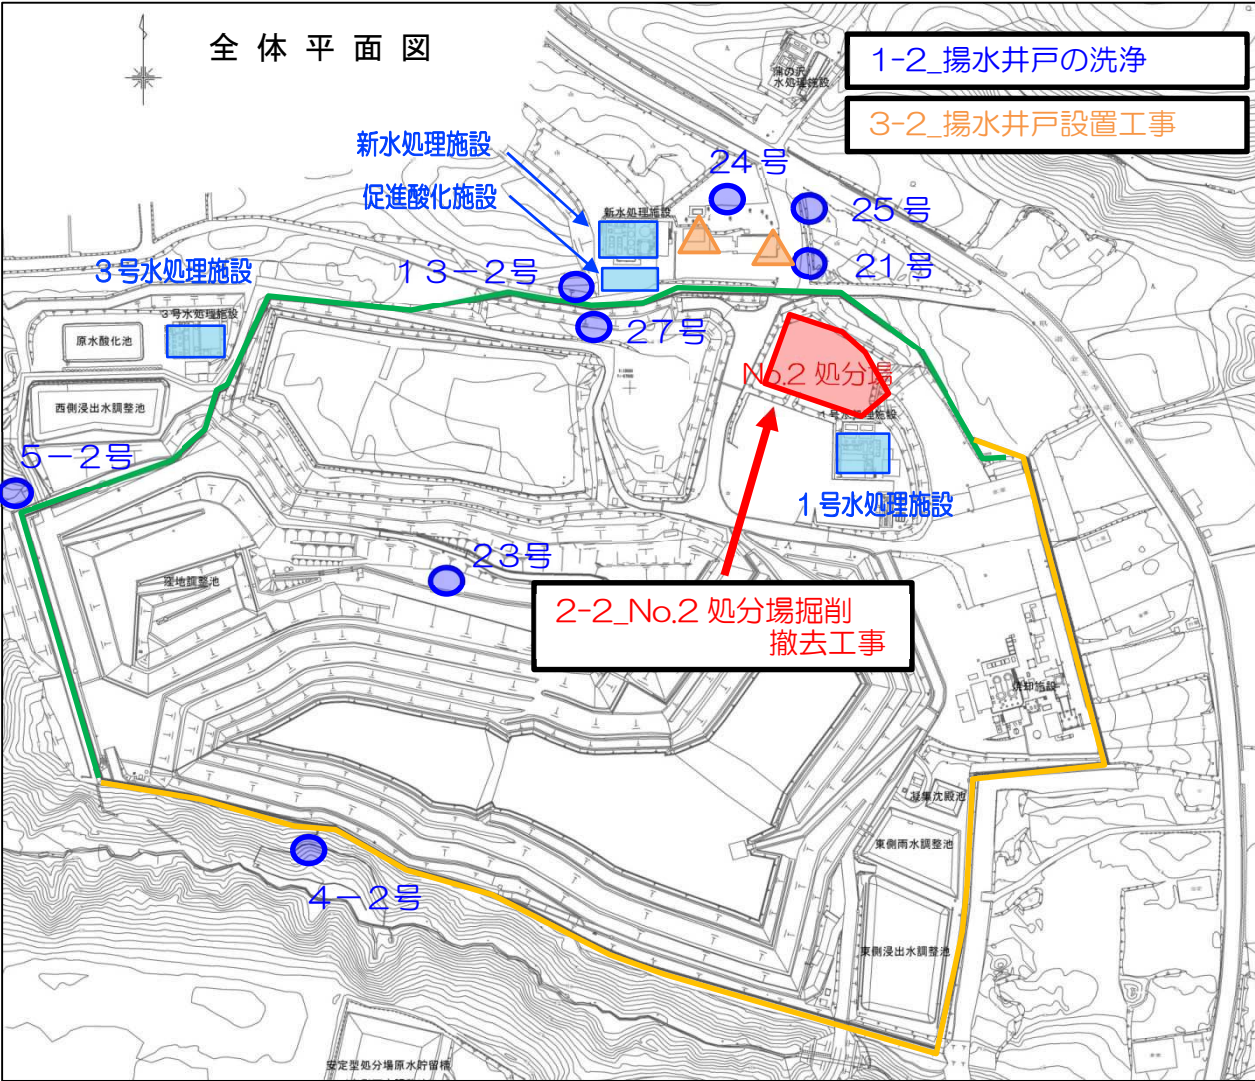

2 処分場掘削事業

2-1_目 的

・ 本工事は平成 2 9 年度に実施した支障物 (廃油入りドラム缶) 掘削工事を令和 2 年度も引き続き実施し、No. 2 処分場のドラム缶の撤去をするものである。

2-2_No. 2 処分場掘削撤去工事 : ●

工 期 : 令和 2 年 5 月 2 0 日 ~ 令和 2 年 1 2 月 1 8 日

工事概要 : ドラム缶掘削撤去工 1 式

掘削工 V = 2, 2 4 0 m³、 運搬処分工 N = 1 式

保管場工 N = 1 式、 水質分析・土壌分析 N = 1 式

撤去したドラム缶 N = 6 5 1 本

(令和 3 年度以降運搬処分予定)

3 揚水井戸設置事業

3-1_目 的

・ 蒲の沢滲出水の 1, 4-ジオキサン濃度低減対策として、上流側に位置する遮水壁外北側に揚水井戸を設置するものである。

3-2_揚水井戸設置工事 : ▲

工 期 : 令和 2 年 1 1 月 2 0 日 ~ 令和 3 年 3 月 2 6 日

工事概要 : 揚水井戸設置 N = 2 基 令和 3 年 4 月 1 日揚水開始

4 環境モニタリング事業

4-1_目 的

・ 周辺環境への影響を把握するため、揚水井戸、観測井戸、下水道放流水等の水質調査を実施するものである。

4-2_環境モニタリング実績

・ 調査地点数 : 1 5 7

・ 調査検体数 : 3 3 5

・ 調査項目数 : 4, 0 5 1
