

森吉ダムの洪水調節効果【秋田県】（速報）

別 紙


※今後の調査により数値等が変わる場合があります。

概 況

森吉ダムでは、9月2日10時から前線（低気圧）の影響による降雨に伴い出水量が増大したため、洪水調節を行いました。

森吉ダムにおける最大流入量は139.59m³/sまで上昇しました。洪水調節の結果、調節量として135.91m³/s、約575千m³の水をダムに貯留しました。


降雨の状況（森吉ダム流域平均雨量）

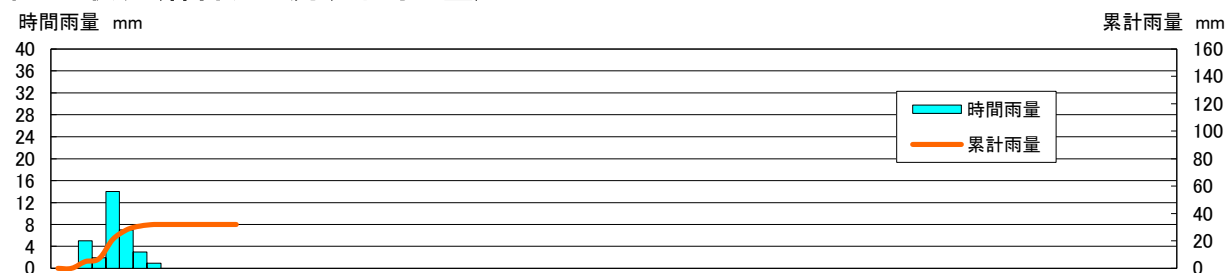

雨量レーダーエコー（9月2日 12時30分）



森吉ダム 洪水調節の状況

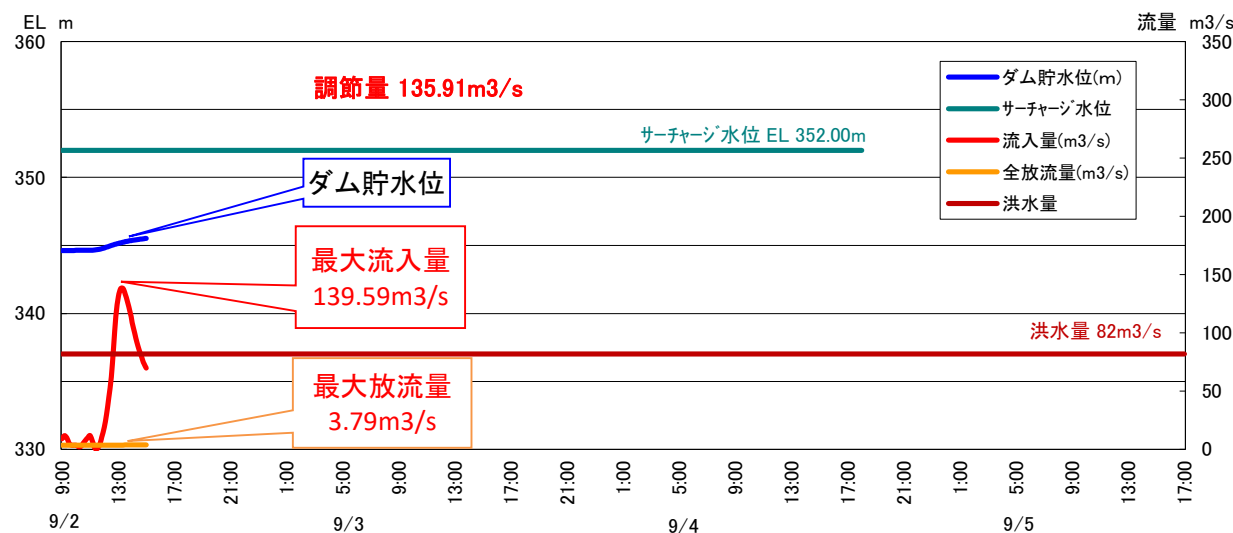

森吉ダム諸元

河 川 名	米代川水系 小又川
形 式	重力式コンクリートダム
堤 高	62. 0m
堤 長	105. 0m
堤 体 積	75,000m ³
集 水 面 積	139. 00km ²
湛 水 面 積	1. 56km ²
有 効 貯 水 量	26, 900, 000m ³
サーチャージ水位	EL=352. 00m
洪 水 流 量	82m ³ /s
竣 工 年 度	昭和28年
