

建設部

建設委員会 【議案関係資料】

9月8日提出

令和7年第2回定例会（9月議会）
建設部 提出資料

令和7年9月8日
建設部

建設委員会・分科会
【予算・議案関係】

○ 建設部	令和7年度9月補正予算案の概要について	・・・ 3
○ 道路課	工事請負契約の締結について	・・・ 5
○ 河川砂防課	県単河川改良事業 鎧畑ダムに係る債務負担行為の設定について	・・・ 8
	工事請負変更契約の締結について	・・・ 9
○ 港湾空港課	港湾施設補修事業 荷役機械に係る債務負担行為の設定について	・・・ 11
	財産の取得の変更について	・・・ 12

令和7年度9月補正予算案の概要について

建設部

1 一般会計 30,000千円

(1) 補正予算 30,000千円

事業の内訳 (単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
あきた循環のみず協働推進事業	30,000	生活排水処理に関するサービス水準を維持するため、市町村共同発注に要する経費

(2) 繰越明許費 35,000千円

・都市公園安全安心事業

(3) 債務負担行為 (110,000千円)

事業の内訳 (単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
県単河川改良事業	110,000	鎧畑ダム利水放流設備更新

2 港湾整備事業特別会計

(1) 債務負担行為

(50,000千円)

事業の内訳

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
港湾施設補修事業	50,000	秋田港外港地区ベルトコンベア修繕

工事請負契約の締結について

道 路 課

1 概要

令和7年7月及び8月に仮契約をした工事の請負契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定に基づき、議会の議決に付す。

2 契約内容

(1) 一般国道105号 幸屋渡工区

- ①工 事 名 地方道路交付金工事（改築）
- ②路 線 名 一般国道105号
- ③場 所 北秋田市阿仁幸屋渡 地内
- ④工事内容 マタギの里トンネル L=121.0m


掘削・支保工、覆工コンクリート・防水工、
 インバート工、コンクリート舗装工
- ⑤工 期 契約締結の日から令和9年10月26日まで
- ⑥相手方・金額

対象構造物	相手方	金額
マタギの里トンネル	秋田・花岡・藤島 特定建設工事共同企業体	1,485,000,000 円

⑦工程表

年度		令和7年度												令和8年度	令和9年度
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
一般国道 105号 幸屋渡工区	マタギの里 トンネル							契約 ○							
							9月 議会		準備工			トンネル本体工			トン ネル 舗装工

概要図

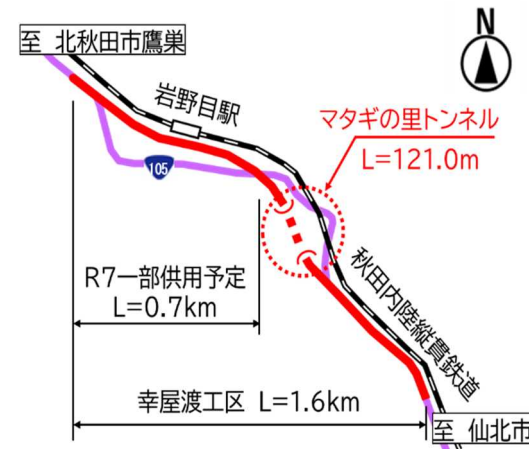

一部供用箇所



施工箇所



トンネル坑口部
(北秋田市鷹巣側)



トンネル坑口部
(仙北市側)

(2) 秋田港アクセス道路


- ①工 事 名 秋田港アクセス道路整備工事
- ②路 線 名 主要地方道秋田天王線(秋田港アクセス道路)
- ③場 所 秋田市飯島川端二丁目 地内 外
- ④工事内容 1号橋 L=74.0m
2号橋 L=364.5m
〔鋼橋製作工、鋼橋輸送工、鋼橋架設工、
現場塗装工〕
- ⑤工 期 契約締結の日から令和10年10月31日まで
- ⑥相手方・金額

対象構造物	相手方	金額
1号橋	高田・アキモク・東北機械 特定建設工事共同企業体	792,000,000 円
2号橋	宮地・日本機械・東北機械 特定建設工事共同企業体	763,400,000 円


⑦工程表

年度		令和7年度												令和8年度	令和9年度	令和10年度
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
秋田港 アクセス 道路	1号橋 及び 2号橋							契約 ○								
							9月 議会							照査、設計	桁製作	桁架設


概要図

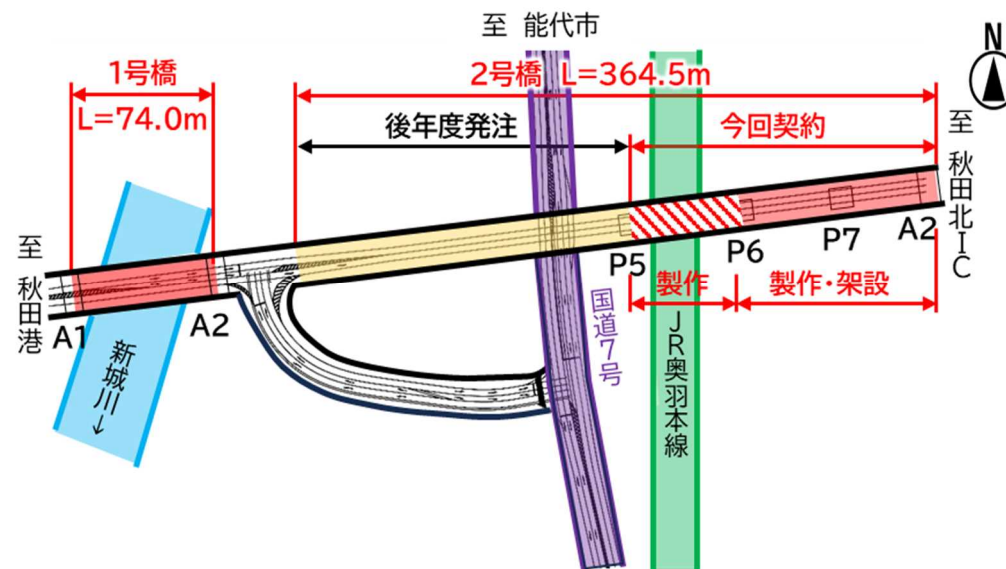

施工箇所

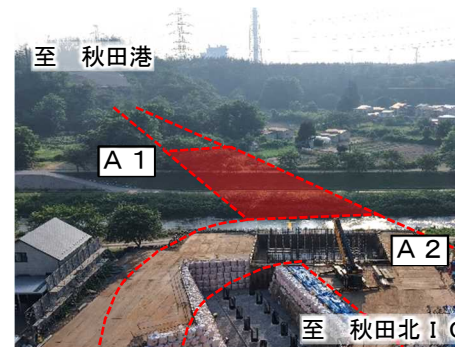

1号橋

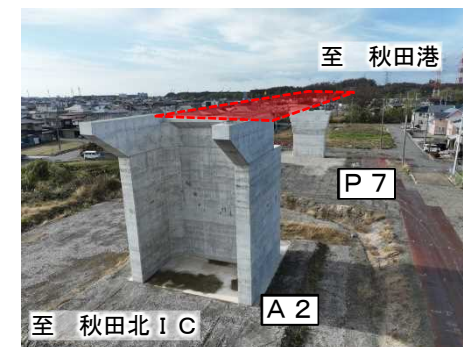

2号橋

(3) 主要地方道秋田北野田線 秋田中央道路トンネル

- ①工 事 名 道路災害関連工事
 ②路 線 名 主要地方道秋田北野田線
 (秋田中央道路トンネル)
 ③場 所 秋田市東通 地内 外
 ④工事内容 起伏式止水板 (2箇所)
 脱着式止水パネル (1箇所)
 壁増打ち工

⑤工 期 契約締結の日から令和8年3月31日まで

⑥相手方・金額

対象構造物	相手方	金額
止水板ほか	板橋組・東北機械製作所 特定建設工事共同企業体	885,500,000 円

⑦工程表

年度	令和7年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
秋田中央道路 トンネル							契約 ○					
			公告 入札			9月 議会		止水板ほか				

令和5年7月被災状況写真



トンネル内




トンネル外 (駅東)


起伏式止水板設置イメージ図




中央街区出口

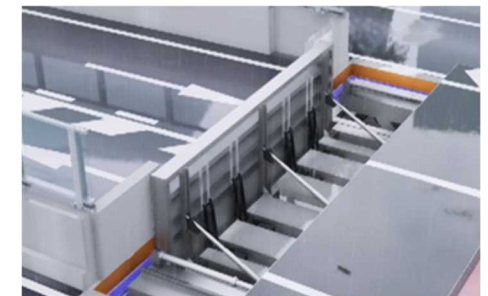

止水板起立時

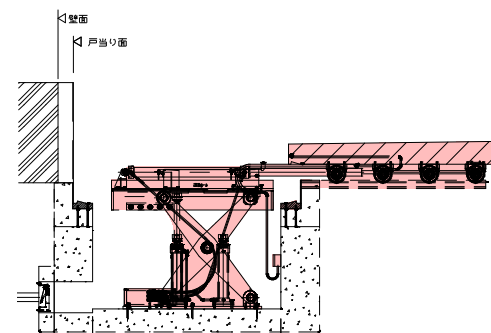

路面パネルスライド時断面図

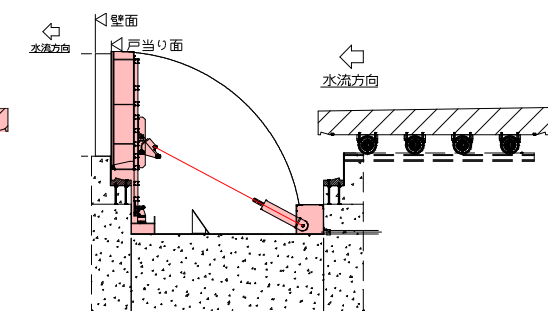

止水板起立時断面図

1 概要

- ・鎧畑ダムの利水放流設備は、設置後35年が経過し、老朽化と発錆が進行
- ・設備が故障した場合、事前放流等のダム操作に支障を来すおそれがあるため、早急な設備の更新が必要
- ・設備の製作から据付までの工期が2ヶ年にわたることから、債務負担行為を設定

2 事業内容

(1) ダム名・場所

鎧畑ダム（仙北市田沢湖田沢）

(2) 内容


利水放流設備更新

- ・工事内容：油圧ユニット交換、油圧シリンダー分解整備
- ・工 期：令和7年11月～令和9年3月
- ・設 定 額：110,000千円

3 工程表


年度	令和7年度							令和8年度											
月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
内容	契約 ○																		
	公告 入札		準備工		油圧ユニット交換、油圧シリンダー分解整備														

位置図

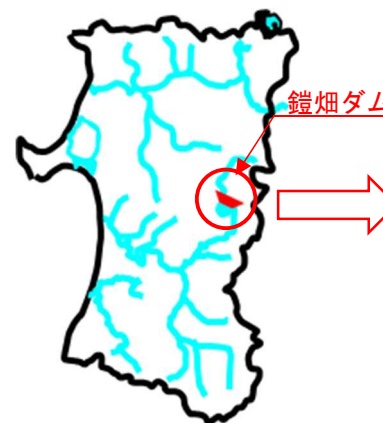

利水放流設備の位置

利水放流設備は農業用水や洪水調節
流量の確保等のために使用

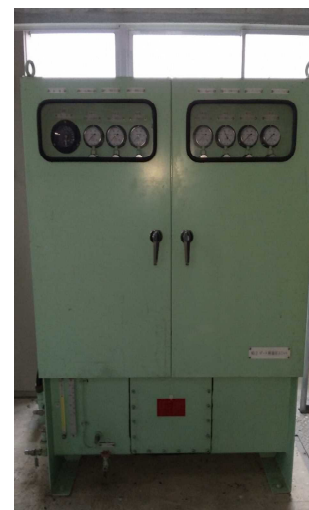

油圧ユニット交換
設置後35年経過



油圧シリンダー分解整備
設置後35年経過

工事請負変更契約の締結について

河 川 砂 防 課

1 概要

令和6年7月5日に議決を経た太平川河川改修工事の内容を変更する必要があることによる変更契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定に基づき、議会の議決に付す。

2 契約内容

(1) 工 事 名 河川激甚災害対策特別緊急工事

(2) 河 川 名 太平川

(3) 場 所 秋田市檜山川口境 ほか

(4) 工事内容 河道掘削工
法覆護岸工
矢板護岸工
仮栈橋 ほか

(5) 工 期 令和6年7月12日から令和10年3月17日まで（1，2，3，5工区：変更無し）
令和6年7月12日から令和11年3月16日まで（4工区：今回変更）

(6) 相手方・金額

工区	相手方	変更前	変更後
1工区	加藤建設・三和興業・広洋産業特定建設工事共同企業体	1,064,800,000 円	1,197,434,700 円
2工区	沢木組・板橋組・天喜建設特定建設工事共同企業体	1,459,700,000 円	1,885,755,300 円
3工区	住建・豊島・藤田特定建設工事共同企業体	1,801,800,000 円	2,137,447,400 円
4工区	菅与・秋田瀝青・セコー特定建設工事共同企業体	1,669,800,000 円	2,288,498,300 円
5工区	清水組・加藤建設・中山組特定建設工事共同企業体	1,542,420,000 円	1,835,671,200 円

事業概要図



3 変更理由

【増額変更】


- (1) 現地地盤が想定より硬質で、当初の圧入工法では矢板が貫入せず、施工方法の変更が必要のため。

変更後の工法

掘削機と矢板圧入機を連動させ、地盤を掘削しながら、矢板を貫入させていく工法



- (2) 詳細設計の結果、十分な河道面積を確保する上で護岸形状の変更が必要となったことに加え、河道掘削土量及び発生土運搬量が増えるため。

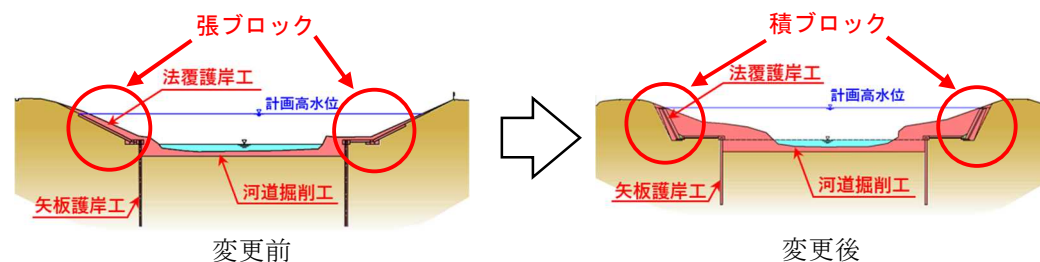

張ブロックから積ブロックへ変更することで、護岸が急勾配となり、掘削土量は増えるが、その分河道面積を広く確保できる。


【工期延長】

- (3) J Rとの施工調整の結果、J R羽越本線の橋梁補強工事において4工区内の工事用道路の使用が必要となり、橋梁工事期間中は護岸工事を施工できないため。



① 4 工区全景

標準横断面図



道路幅の関係上、堤防を拡幅し工事用道路として使用しているため、工事用道路使用中は法覆護岸工事に着手できない。

港湾施設補修事業 荷役機械に係る債務負担行為の設定について

港 湾 空 港 課

1 概要

- ・県が平成11年に設置した秋田港外港地区のばら積み貨物用ベルトコンベアは、令和7年4月以降、不具合が断続的に発生
- ・製造メーカーおよび点検事業者による緊急点検の結果、ローラーの摩耗箇所等を確認したことから早急な修繕が必要
- ・ローラーの製作から設置までの工期が2ヶ年にわたることから、債務負担行為を設定

2 事業内容

(1) 場所 秋田港外港地区

(2) 内容

- ・工事内容：ローラーの製作、設置（3本）
- ・工期：令和7年11月～令和8年9月
- ・金額：50,000千円

3 工程表

年度	令和7年度							令和8年度					
月	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
内容			契約 ○										
				ローラー製作、設置									

位置図



ベルトコンベア



ローラー

財産の取得の変更について

港 湾 空 港 課

1 概要

- ・老朽化した空港用高速スノーパー除雪車の更新について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第三条に規定される、「予定価格7千万円以上の動産の買入れ」に該当することから、令和6年2月議会で議決
- ・下記内容により、納入期限の変更を行う必要が生じたため、議会の議決に付す

2 内容

取 得 品	空港用高速スノーパー除雪車
納 入 場 所	秋田空港
数 量	1 台
契約金額（税込）	1 4 4, 9 8 0, 0 0 0 円
契 約 相 手 方	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 第一実業(株) 代表取締役 船渡 雄司
当 初 契 約 日	令和6年3月1日
契 約 変 更 内 容	
①納入期限(当初)	令和7年10月31日
②納入期限(変更)	令和8年 2月27日
現車両取得年月	平成14年11月

3 契約変更理由

車両の製造メーカーにおいて、製造に携わる技術者の離職等が相次ぎ人材不足に陥っており、生産計画に遅延が生じているため。

4 工程表

年度	R5年度	R6年度	R7年度											
月	3	...	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
当初	契約 ○													
		製造					輸送		納入					
変更	契約 ○													
		製造								輸送		納入		

5 現車両写真

