

# 建設部

## 建設委員会

### 【議案関係資料】

### (補正予算関係)

2月13日提出

令和8年第1回定例会（2月議会）  
建設部 提出資料（補正予算関係）

令和8年2月13日  
建設部

建設委員会・分科会  
【予算・議案関係】

○ 建設部	令和7年度2月補正予算案の概要について	・・・	3
○ 都市計画課	令和7年度2月補正予算案の概要について	・・・	4
○ 道路課	工事委託変更契約の締結について	・・・	5
	工事委託契約の締結について	・・・	6
○ 港湾空港課	公の施設の指定管理者の指定について	・・・	7

## 令和7年度2月補正予算案の概要について

建設部

### 1 一般会計

#### (1) 補正予算

①事業費の決算見込み等による補正

△7,361,269千円

②物価高騰対策による補正

△7,540,570千円

③給与費の決算見込み等による補正

195,000千円

△15,699千円

#### (2) 繰越明許費

43,419,664千円

現年発生土木災害復旧事業、過年発生土木災害復旧事業、地方道路交付金事業等

#### (3) 債務負担行為

319,354千円

あきた循環のみず協働推進事業、秋田三港クルーズ活性化促進事業

### 2 特別会計

#### (1) 補正予算

△127,776千円

港湾整備事業の決算見込み等による補正

### 3 下水道事業会計

#### (1) 補正予算

△1,892,456千円

下水道事業の決算見込み等による補正

# 令和7年度2月補正予算案の概要について

## 1 概要

県管理都市公園施設において、電気料金の負担軽減を図るため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(国費10/10)を活用し、省エネタイプの設備に更新する。

## 2 事業の内訳

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
都市公園環境整備促進事業	195,000	照明設備の更新

## 3 事業内容

(1) 場所 県立中央公園

(2) 内容

①陸上競技場メインスタンド

屋内照明設備更新(LED化) 1式 92,000千円



全景



メインスタンド外観



会議室



屋内練習走路

②テニスコート

照明設備更新(LED化) 1式 103,000千円



全景



夜間利用状況

# 工事委託変更契約の締結について

## 1 概要

令和6年3月に契約した工事の内容を変更する必要が生じたことによる委託変更契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定に基づき、議会の議決に付す。

## 2 契約内容

- ① 工 事 名 地方道路交付金工事
- ② 路 線 名 国道105号
- ③ 場 所 仙北市角館町上菅沢 地内（角館跨線橋）
- ④ 工事内容 橋長L=34.1m 幅員W=8.0m  
支承受替工、床版取替工、防護柵取替工等
- ⑤ 工 期 令和4年6月21日から令和9年3月31日まで
- ⑥ 相手方・金額

相手方	変更前	変更後
東日本旅客鉄道株式会社	413,788,100円	556,559,559円

## ⑦ 工程表

年度 月	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度	
	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期
当初	○ 当初契約									
	JR入札手続き等	準備工	下部工補修工、主桁補修補強工、支承受替工、床版取替工、防護柵取替工				後片付			
変更	○ 当初契約								○ 変更契約	
	JR入札手続き等	準備工	下部工補修工、主桁補修補強工、支承受替工、床版取替工、防護柵取替工				後片付			

## 3 変更理由

### 【増額変更】


- ・ 支承受替において、設置箇所が狭隘であったことによる既設部材の加工等の追加
- ・ 支承、床版、防護柵の資材価格及び労務費の上昇

### 【工期延長】

- ・ 既設部材の加工等に伴う調査・設計・工場製作に約12か月を要したことから工期を延長

### 側面図

橋長 L=34.1m

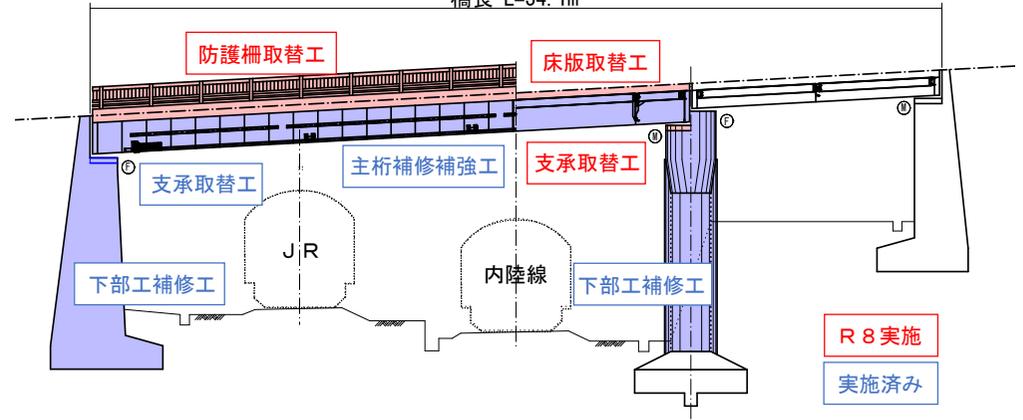

### 施工箇所



# 工事委託契約の締結について

## 1 概要

工事の委託契約の締結について、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第2条の規定に基づき、議会の議決に付す。

## 2 契約内容


- ① 工 事 名 秋田港アクセス道路整備工事
- ② 路 線 名 主要地方道秋田天王線（秋田港アクセス道路）
- ③ 場 所 秋田市飯島道東三丁目 地内
- ④ 工事内容 2号橋上部工  
P5～P6 L=57.0m  
鋼橋架設工、床版工
- ⑤ 工 期 契約締結の日から令和11年7月31日まで
- ⑥ 相手方・金額

相手方	金額
東日本旅客鉄道株式会社	1,401,015,000 円


## ⑦ 工程表

年度	令和7年度			令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度	
	12	1	2	3	上半期	下半期	上半期	下半期	上半期	下半期	
秋田港 アクセス 道路	2号橋 上部工 (P5～P6)			12月 J R 協議	2月 議 会	J R 入札手続き等		架設準備工 (仮設工等)		鋼橋架設工 床版工	
	契約										後 片 付


## 概要図

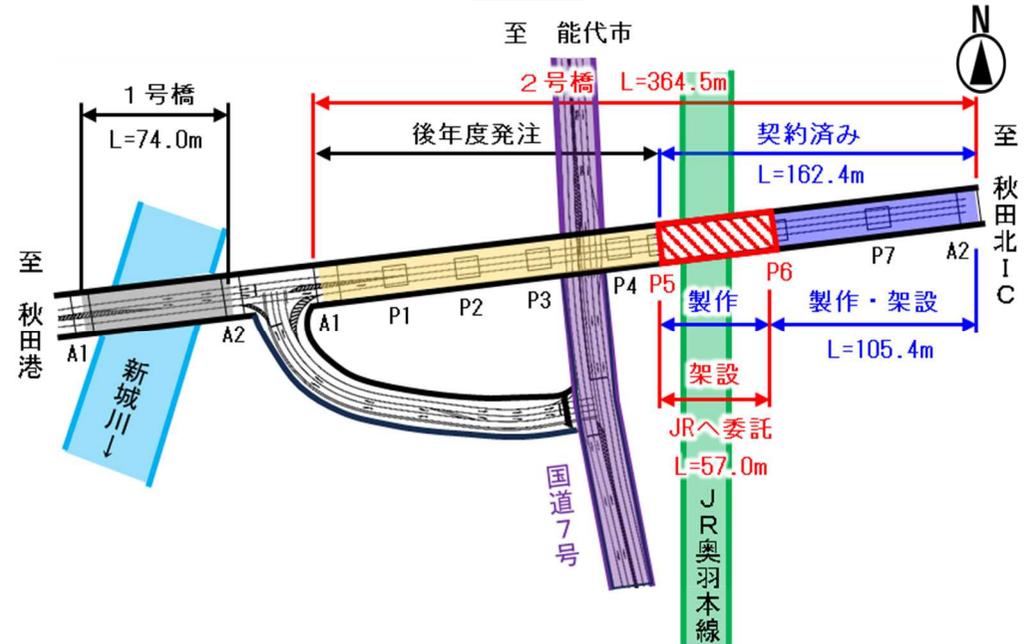

## 施工箇所

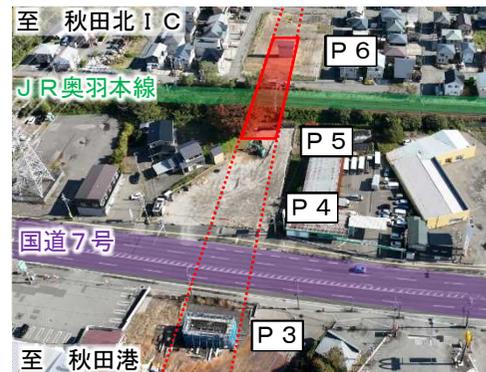

2号橋 (A1側より)

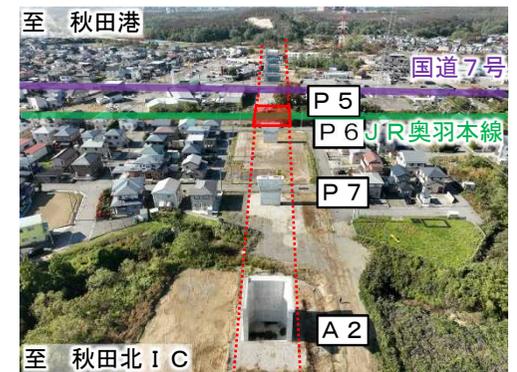

2号橋 (A2側より)

# 公の施設の指定管理者の指定について

港 湾 空 港 課

## 1 概要

秋田県公の施設に係る指定管理者の指定の手續等に関する条例第6条の規定により、下記施設について、次の団体を指定管理者として指定する。

施設名	指定管理者（候補者）
秋田県大館能代空港周辺ふれあい緑地	株式会社友愛ビルサービス

## 2 指定期間

1年間（令和8年4月1日～令和9年3月31日）

## 3 指定管理者の候補者選定

### （1）公募手續

- ①募集期間 令和7年12月12日～12月26日
- ②周知方法 県公報、県公式サイト（美の国あきたネット）
- ③申請状況 上記1の候補者のみ

### （2）候補者選定委員会

①委員の構成（内部委員1名を含む計5名）

氏名	所属・職業等	備考
井上 誠	秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 教授	学識経験者
菅原 寛行	秋田市 都市整備部 住宅政策課 課長	行政関係者
土田 昌幸	GSPartners 税理士法人 税理士	財務・会計
山崎 純	NPO 法人 子育て応援 Seed 理事長	子育て支援
佐藤 正美	秋田県 建設部 次長	内部委員

### ②開催状況

- ・開催日 令和8年1月14日
- ・審査内容 制度概要・施設概要・審査基準等説明  
質疑応答、採点審査、候補者選定

### ③選定結果

効率的な運営や管理能力等の適格性が認められたことから、上記候補者を指定管理者として選定する。

## 4 今後の管理・運営

前回の公募で応募が無かったことを踏まえ、現在の指定管理者にサウンディングを実施し、令和9年度以降の指定管理者公募に向けて施設の持続可能なあり方に関する検討を進める。

### （1）持続可能な管理・運営のための検討事項

- ・開園日、開園時間
- ・各施設の管理形態
- ・利用料金

### （2）今後の予定

- ・北秋田市及び関係機関との協議
- ・次期指定管理料の債務負担行為設定
